

Handover Record Form

219690

Job Start Date	6-Jan-2026			
Prom. Wk	WK05-2(2026)			
Model	AC2-4N7 G4 10"			
Cust. Name	Waken B-Tech Co., Ltd., JAPAN			
JO	219690	WO	2089150	QTY 1

Process Handover (Leader to Leader)

Work Center	PIC	Sign in	Date	Sign Out	Date	Remarks
Punching (n-15)	Pangat	-		li	07/01-26	
Bending (n-13)	Thance		8/01-2026			
Packer (n-11)	Panchehot		09/01/2026			
Welding (n-10)	Mariono		13/01-2026			PD(14/01/2026)
Powder Coating (n-8)	Wan		14/01-26			EMS 67443 B.
Assembly Part A (n-6)	Kaitel		18/26		20/26	EP=1004 OK Check drain VALVE
Assembly Line (n-5)	Limel		20/26		20/26	
PAO Filter Testing (n-4)	Farhan		20/01/2026			main: 17 P91C ni: 0100257 Ex: 11-11-0100167 P9: 25407/28762
Electrical QC (n-3)	Kikan		21/26		21/26	
Testing Room (n-2)	Untan-p		21/26		21/26	
Final QA (n-1)	Pizny		22/26		23/2026	lubang drain valve ok lomo
Packaging (n)	Stan		23/26			312 KG
Test Admin (n)	Ybanta		21/26		21/26	

EP=1004

L.1

TRAVELER RECORD FORM

Order Date 26/12/2025

PR WK	WK05-2(2026)	JO	219690-CAR
CUSTOMER	Waken B-Tech Co., Ltd., JAPAN	WO	2089150
MODEL	CARCASS, AC2-4N7 G4 10"		

WORKPLACE	NAME	PLN.START	PLN.END	REMARKS	MES ORDER BARCODE
OPER.NO		ACT.START	ACT.END		

PNC-EM-B	Anca / Een	06.01.2026, 07:30:00	06.01.2026, 15:30:00		
30	RIDHO / Anca n	05/01/2026	07/01/2026		219690-CAR030
BND-RGE	Rhen	10.01.2026, 07:30:00	10.01.2026, 15:30:00		
60		07/1-26	07/1-26		219690-CAR060
PACKER-1	Asmeu	12.01.2026, 07:30:00	12.01.2026, 15:30:00		
70		09/1-2026			219690-CAR070
WLD-A	FSS	13.01.2026, 07:30:00	13.01.2026, 15:30:00		
144		13/01-2026			219690-CAR0144
PC-A	LINE A	17.01.2026, 07:30:00	17.01.2026, 15:30:00		
171		14/01-2026			219690-CAR0171
ASM-PA1	TIT72	19.01.2026, 07:30:00	19.01.2026, 15:30:00		
239		19-01-26	19-01-26		219690-CAR0239
ASM-L1	I	20.01.2026, 07:30:00	20.01.2026, 15:30:00		
240		20/01/26	20/01/26		219690-CAR0240

SOAP BUBBLES / PRESSURE TEST TO NSF/ANSI 49 FOR BSC CLASS II

Cabinet Model : AC2-4N7-G4-10
Serial Number : 219690

Pressure test method & result (tick one):
☒ Pressure retention after 10 min: 125 in w.g. (Pa)
Within 0.5 in w.g. / 125 Pa $\pm$ 10%
☐ No soap bubbles at 0.5 in w.g. / 125 Pa $\pm$ 10%

Tested by : LEWIN
Date : 20 JANUARY 2026
Checked by : PAUL
Confirmed by : ROBERT S

TRAVELER RECORD FORM

Order
Date

26/12/2025

PR WK	WK05-2(2026)	JO	219690-000
CUSTOMER	Waken B-Tech Co., Ltd., JAPAN	WO	2089150
MODEL	AC2-4N7 G4 10"		

WORKPLACE	NAME	PLN.START	PLN.END	REMARKS	MES ORDER BARCODE
OPER.NO		ACT.START	ACT.END		

EL.TEST1	<i>Rikai</i>	21.01.2026, 07:30:00	21.01.2026, 15:30:00		 219690-0000360
360		<i>21/1/2026</i> <i>jan</i>	<i>21/1/2026</i> <i>jan</i>		
TEST-1	<i>London P</i>	25.01.2026, 07:30:00	25.01.2026, 15:30:00		 219690-0000380
380		<i>21/01/2026</i> <i>21/01/2026</i>	<i>21/01/2026</i> <i>21/01/2026</i>		
PRINTING	<i>M/A</i>	25.01.2026, 07:30:00	25.01.2026, 15:30:00		 219690-0000385
385		—	—		
CLEAN-SC	<i>Rizky</i>	26.01.2026, 07:30:00	26.01.2026, 15:30:00		 219690-0000410
410		<i>22.1.2026</i>	<i>22.1.2026</i>		
QA-SC	<i>Resha</i>	26.01.2026, 07:30:00	26.01.2026, 15:30:00		 219690-0000420
420		<i>23-1-2026</i>	<i>23-1-2026</i>		
PACKING	<i>Muhannad</i>	27.01.2026, 07:30:00	27.01.2026, 15:30:00		 219690-0000430
430		<i>23/1/26</i>	<i>23/1/26</i>		
FG-WH	<i>M/A</i>	27.01.2026, 07:30:00	27.01.2026, 15:30:00		 219690-0000450
450		—	—		

WORKS ORDER FORM

COMPANY INFORMATION		PRODUCT FAMILY		REV	DATE
Company	Waker B-Tech Co., Ltd.	AIRSTREAM® BSC, CLASS II A2, AC2-4N7 G4 10"		0	17/DEC/25
Country	Japan				
PO Number	E25105				
ESCO PF No.	SO-235312				
FACTORY INFORMATION		ELECTRICAL REQUIREMENT			
Model Code	AC2-4N7 G4 10"	Power Supply	7 - 100 VAC / 50/60 HZ		
Works Order No.	2089150	Cordset Qty.	1	Plug Code	A
Serial No.(s)	219688, 219689, 219690 219691, 219692				
SHIPMENT DETAILS AND PROMISED DATE		SOFTWARE REQUIREMENT			
Promised Date / Week (Ex-Bintan)	05 (2026)	Airflow Alarm	Measurement Unit		
		Enable?	Metric		
Weekly Vessel Days	SUNDAY/WEDNESDAY	FIXTURES POSITION			
Destination Port					
Mode of Shipment	SeaFreight FCL 1x40'&1x20'				
Base Cabinet / Base Cabinet WO					
Fumigation	No				
Shipment Terms	EX-WORKS				
MAIN CABINET ORDER					
Item No.	Description	Description 2	Qty.		
2011610	AIRSTREAM® BSC, CLASS II A2, AC2-4N7 G4 10"	1.2M/4', TOUCHSCREEN, 100 VAC 50/60HZ, JAPAN	5	✓	
5170027	CORDSET CODE A	CODE A	5	✓	
5170071	ELECTRICAL OUTLET, GFCI	CODE A - GFCI	10	✓	
5170255	UV TUBE 30W		5	✓	
5131499	SUPPORT STAND, SPLC-4N0 G4	FOR 4FT CABINET 570MM HEIGHT	5	✓	
SPECIAL ACCESSORIES					
CUSTOMIZATIONS / REMINDERS					
Type	Description	Reference Document / Remark By			
NSF CERTIFIED ONLY FOR AC2-3N7 G4 8", AC2-4N7 G4 (8" & 10"), AC2-5N7 G4 8", and AC2-6N7 G4 (8" & 10") UL CERTIFIED FOR ALL AC2-N G4 EXCEPT AC2-2N7 G4					
WHS/ASSMBLY & QA	Please use laminated Film on Glass	Yanti/Uli/Reynold			
Testing	BURN-IN TEST IS NEEDED, 1 OF 10 CABINETS	Charles M			
Raised By: Eva c/o Amanda		Checked By: Dewi		Doc. No.: FM-OSD-238	
Path: \\192.168.0.17\Esco Operating System\FM-SD-SOP-WI\Order Sales\Processing\FM					

Name: Angel

Date: 05 JAN 2023

WORKS ORDER FORM

COMPANY INFORMATION		PRODUCT FAMILY		REV	DATE
Company	Waken B-Tech Co., Ltd. ✓	AIRSTREAM® BSC, CLASS II A2, AC2-4N7 G4 10"		0	17/DEC/25
Country	Japan ✓				
PO Number	E25105 ✓				
ESCO PF No.	SO-235312 ✓				
FACTORY INFORMATION		ELECTRICAL REQUIREMENT			
Model Code	AC2-4N7 G4 10" ✓	Power Supply	7 - 100 VAC / 50/60 HZ ✓		
Works Order No.	2089150 ✓	Cordset Qty.	1 ✓	Plug Code	A ✓
Serial No.(s)	219688, 219689, 219690, 219691, 219692 ✓				
SHIPMENT DETAILS AND PROMISED DATE		SOFTWARE REQUIREMENT			
Promised Date / Week (Ex-Bintan)	05 (2026)	Airflow Alarm	Measurement Unit		
		Enable	Metric		
Weekly Vessel Days	SUNDAY/WEDNESDAY	FIXTURES POSITION			
Destination Port					
Mode of Shipment	SeaFreight FCL 1x40'&1x20'				
Base Cabinet / Base Cabinet WO					
Fumigation	No				
Shipment Terms	EX-WORKS				
MAIN CABINET ORDER					
Item No.	Description	Description 2	Qty.		
2011610	AIRSTREAM® BSC, CLASS II A2, AC2-4N7 G4 10"	1.2M/4', TOUCHSCREEN, 100 VAC 50/60HZ, JAPAN	5 ✓		
5170027	CORDSET CODE A	CODE A	5 ✓		
5170071	ELECTRICAL OUTLET, GFCI	CODE A - GFCI	10 ✓		
5170255	UV TUBE 30W		5 ✓		
5131499	SUPPORT STAND, SPLC-4N0 G4	FOR 4FT CABINET 570MM HEIGHT	5 ✓		
SPECIAL ACCESSORIES					
CUSTOMIZATIONS / REMINDERS					
Type	Description	Reference Document / Remark By			
NSF CERTIFIED ONLY FOR AC2-3N7 G4 8", AC2-4N7 G4 (8" & 10"), AC2-5N7 G4 8", and AC2-6N7 G4 (8" & 10") UL CERTIFIED FOR ALL AC2-N G4 EXCEPT AC2-2N7 G4					
WHS/ASSMBLY & QA	Please use laminated Film on Glass	Yanti/Uli/Reynold			
Testing	BURN-IN TEST IS NEEDED, 1 OF 10 CABINETS	Charles M			
Raised By: Eva c/o Amanda		Checked By: Dewi		Doc. No.: FM-OSD-238	
Path: \\192.168.0.17\Esco Operating System\FM-SD-SOP-WI\Order Sales Processing\FM					

OK @ (Franco)

Campan

Cell 300 over

Angel

05 JAN 2023

Date:

"THESE DRAWINGS AND SPECIFICATIONS ARE THE EXCLUSIVE PROPERTY OF ESCO, ISSUED IN STRICT CONFIDENCE AND SHALL NOT, WITHOUT PRIOR WRITTEN PERMISSION OF ESCO, BE REPRODUCED"




Headquarters: Esco Micro Pie Ltd
19 Changi South Street 1
Singapore 486779
Tel: +65 65420833 Fax: +65 65426920
Web: www.escolifesciences.com

COMPLETENESS PARTS LIST

REVISION
B

CABINET MODEL : AC2-4N,S7,8,9-NS G4 8",10"

NO.	ITEM CODE	DESCRIPTIONS	QTY	COLOUR	WLD QA	IPQC	ASSY
1	5211723	WELDED FRONT PANEL	1	ESCO WHITE	✓	✓	✓
2	5208880	BASE ELECTRICAL PANEL	1	ESCO WHITE	✓	✓	✓
3	5208879	COVER ELECTRICAL PANEL	1	ESCO RED	✓	✓	✓
4	5211756	FRONT COVER	1	ESCO RED	✓	✓	✓
5	5211765	WELDED DOWNFLOW PLENUM	1	ESCO WHITE	✓	✓	✓
6	5211758	WELDED TELESCOPING	1	ESCO WHITE	✓	✓	✓
7	5211762	BASE FILTER	1	ESCO WHITE	✓	✓	✓
8	5211761	WELDED CARCASS	1	ESCO WHITE	✓	✓	✓
9	5211774	TOP DAMPER	1	ESCO RED	✓	✓	✓
10	5211773	BASE DAMPER	1	ESCO RED	✓	✓	✓
11	5020879	BALANCING	1	ESCO WHITE	✓	✓	✓
12	5191841	COVER PIPING	2	ESCO WHITE	✓	✓	✓
13,14	5211853	SIDE COVER	2 R&L	ESCO WHITE	✓	✓	✓
15,16	5211777	DOWNFLOW CLAMP	2 R&L	ESCO WHITE	✓	✓	✓
17,18	5211779	EXHAUST CLAMP	2 R&L	ESCO WHITE	✓	✓	✓
19	5211775	SASH TOP PLATE	1	ESCO WHITE	✓	✓	✓
20	5191574	PAPERCATCH	1	ESCO WHITE	✓	✓	✓
21	5211776	RELAY BRACKET	1	ESCO WHITE	✓	✓	✓
22	5210881	LDC BOARD COVER	1	ESCO WHITE	✓	✓	✓
23	5211771	BLOWER MOUNTING	1	ESCO WHITE	✓	✓	✓
24	5211763	TELESCOPING BRACKET	2	ESCO WHITE	✓	✓	✓
25, 26	5211810	COVER PROFILE	2 R&L	ESCO BLUE	✓	✓	✓
27, 28	5211812	BASE PROFILE	2 R&L	ESCO WHITE	✓	✓	✓

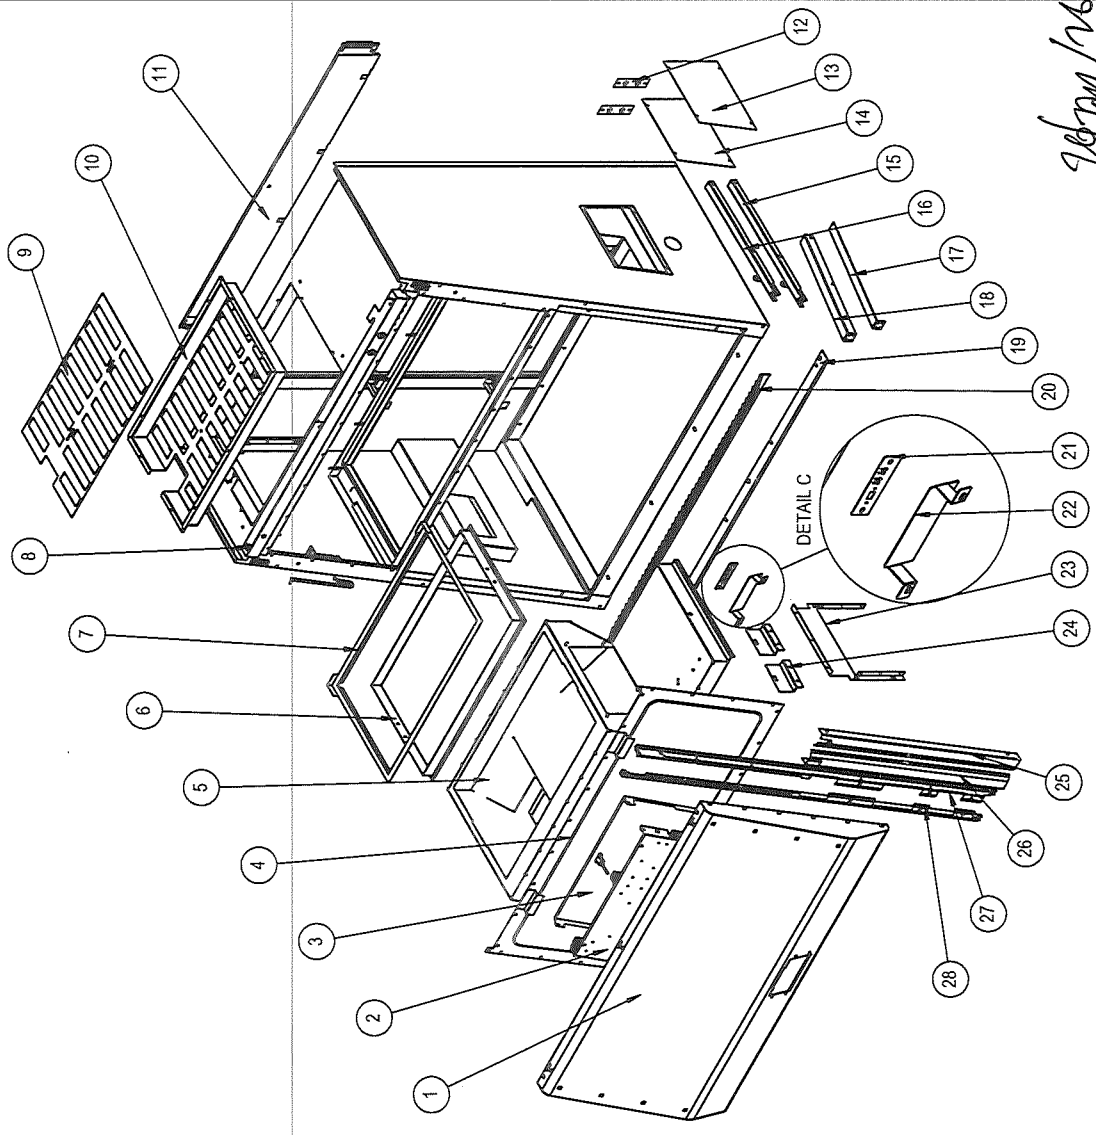

20/01/26

WELDING-QC		IPQC		ASSEMBLY	
NAME: Radi	DATE: 14/01/26	NAME: Roy	DATE: 14-01-26	NAME: (Signature)	DATE: 1
STATUS: Compli	SIGN: (Signature)	STATUS: Complete	SIGN: (Signature)	STATUS: (Signature)	SIGN: (Signature)

AC2-NS G4, AC2-N7 G4, AC2-E/S G4 SC2-G4 WELDING QC CHECKLIST

Model: AC2-N7 G4
WO: 2089150JO Number: 219690

No.	Checklist	Welder	Welding QC	Remarks
1	Gerinda pada front panel, front cover, side modul, back modul, dan bagian atas dari modul harus halus dan rata <i>Grinding on the front panel, front cover, side module, back module, and the top module must be smooth and flat</i>	✓	✓	
2	Dimensi cabinet harus sesuai gambar. Periksa badan cabinet dengan menggunakan besi yang panjang atau aluminium profil, pastikan permukaan luar rata <i>Cabinet dimension is according to drawing. Check the cabinet body with long flat iron bar or aluminium profile, ensure all surfaces are flat.</i>	✓	✓	
3	Periksa diagonal kabinet. Pastikan diagonalnya dalam toleransi (± 1 mm) <i>Check cabinet diagonality. Ensure that the diagonality is within tolerance (± 1 mm)</i>	✓	✓	
4	Periksa kelengkapan part. Gunakan ceklist part untuk memeriksa semua part yang dibutuhkan untuk melengkapi kabinet <i>Check parts completeness. Use parts checklist to check all the parts required to complete the cabinet</i>	✓	✓	
5	Permukaan front panel harus halus dan rata. Penyok, goresan, bekas welding atau gerinda tidak diperbolehkan <i>Front panel and blue panel surface must be smooth and flat. Any dents, scratches, welding or grinding mark is not allowed</i>	✓	✓	
6	Pastikan bracket LED di front panel dipasang menggunakan jig/template <i>Ensure LED base on front panel is welded using jig/template</i>	✓	✓	
7	Periksa apakah stud (4 stud) untuk memasang box elektrik pada front panel sudah terpasang. Pastikan electrical box dapat terpasang pas pada tempatnya. Pastikan template yang digunakan sesuai. <i>Check whether the stud (4 studs) for mounting the electrical box on the front panel is already done and ensure that the electrical box can be properly mounted in its place. Make sure to use the correct template.</i>	✓	✓	
8	Pastikan stopper inner liner terpasang pada back module dan side module <i>Ensure inner liner stopper has been welded on back module and side module</i>	✓	✓	
9	Braket-braket blower housing dan baut untuk menggantung harus di weld sesuai dengan gambar. Periksa apakah bracket stopper filter sudah di weld. Periksa apakah pemasangan part dan lubang-lubang dari blower housing benar orientasinya dan sesuai dengan gambar. Blower frame harus terpasang pas dengan baut di atas base module <i>Blower housing brackets and bolts must be welded according to drawing. Check whether the filter stopper bracket is welded. Check whether the holes orientation on top of the blower housing is correct. Blower frame must be properly installed on the bolts located at the base module</i>	✓	✓	
10	Periksa frame filter (dimana downflow filter dan exhaust filter duduk). Pastikan tidak ada permukaan yang tajam dan harus rata. <i>Check filter frame (where the downflow filter and the exhaust filter are sitting). Ensure that there is no sharp edges and it must be flat.</i>	✓	✓	
11	Pastikan mur pada bracket pengunci filter dilas sesuai e-drawing <i>Ensure the nut on clamping filter bracket is welded as per e-drawing</i>	✓	✓	

No	Checklist	Welder	Welding QC	Remarks
12	Dudukan filter di dalam kabinet harus sesuai dengan gambar <i>Filter housing inside the cabinet must be according to the drawing</i>	✓	✓	
13	Periksa apakah nutsert untuk support stand telah terpasang pada lubang di base drainpan <i>Check whether the nutserts for support stand has been installed on base drainpan hole</i>	✓	✓	
14	Pastikan stud untuk grounding telah terpasang di unit (Periksa terhadap gambar welding stud) <i>Ensure grounding studs are done on the units. (check against stud welding drawings)</i>	✓	✓	
15	Pastikan Frame tempat front cover tidak tajam <i>Ensure front cover opening frame edge must not sharp</i>	✓	✓	
16	Pastikan clamp filter exhaust sesuai dan tidak tajam <i>Ensure exhaust filter clamp is correct and not sharp</i>	✓	✓	
17	Pastikan Clamp filter downflow sesuai, tidak tajam. <i>Ensure downflow filter clamp is correct, not sharp.</i>	✓	✓	
18	Cover elektrik panel harus bisa terpasang pas ke elektrik box <i>Electrical panel cover must be able to fit the electrical box</i>	✓	✓	
19	Pastikan TOP BAR tegak Lurus dan sama rata dengan side module <i>Ensure top bar is perpendicular and level with side modul.</i>	✓	✓	
20	Pastikan STUD gantungan red cover terpasang di carcass menggunakan template yang disediakan <i>Ensure stud for hanging red cover is installed on carcass using provided template</i>	✓	✓	
21	Pastikan side front panel rata dengan cara diukur dengan aluminium mild steel, agar saat pemasangannya sejajar dengan side carcass. <i>Make sure side front panel flat by measuring it using aluminium mild steel, so the installation is paralel with the side carcass</i>	✓	✓	
22	Pastikan Jumlah Tack Weld untuk Real balancing jumlah tack weld nya sudah 3 titik kiri dan kanan. <i>Make sure the number of tack welds for real balancing, the number of tack welds must be 3 points left and right.</i>	✓	✓	

Apabila terdapat informasi yang kurang jelas, lihat e-drawing atau dapat menghubungi designer.
If there is unclear information, see e-drawing or contact designer.

Welder : FSSDate: 13, 01, 2026Welding QC: RudiDate: 14, 01, 2026

QUALITY CONTROL CHECKLIST FOR POWDER COATING

JO Number: 219690
 WO: 2089150
 MODEL: A22-UNT-84

A. Part: Front Panel, Blue Panel and Door		PCQC	REMARK
1	Untuk bagian depan Front Panel, Blue Panel dan Door segala jenis bintik/noda, goresan/scratch, dent/bengkok jika masih terlihat pada jarak 700mm (1 lengan) tidak dapat diterima / For the front of Front Panel, Blue Panel and Door; all types of speckles / stain, scratch, dent / curves, if it is still visible within the distance of 700mm (1 arm) - length is not acceptable.	✓	
2	Hasil powder bagian depan Front Panel, Blue Panel dan Door yang terlalu tipis harus di tolak dan dilakukan powder ulang setelah ketebalannya dipastikan menggunakan positektor di bawah 60micron/ Powder layer result at the front of Front Panel, Blue Panel and Door that is too thin must be rejected and re-powdered, after thickness is confirmed with positector below 60micron	✓	
3	Untuk Bagian samping front panel bintik/noda hanya bisa diterima hanya 2 titik saja dan maksimum lebar masing-masing 1 mm. For the side of the front panel, spots / stains can only be accepted only 2 points only and a maximum width of 1 mm each.	✓	
4	Untuk Bagian samping front panel dent/bengkok jika masih terlihat dari jarak 700 mm tidak dapat diterima. For the side of the front panel, dent / bent if still visible from a distance of 700 mm is not acceptable.	✓	
B. Part: Side Module, Dress Panel, Left and Right Side of Carcass			
5	Untuk bagian side modul/dress panel goresan/scratch halus hanya dapat diterima 2 titik saja dan maksimum panjang 10 mm For the side module/dress panel, scratch/fine scratch can only be accepted 2 points and a maximum length of 10 mm for each point	✓	
6	Untuk bagian side modul/dress panel goresan/scratch kasar dan masih terlihat pada jarak 1 lengan tidak (700mm) dapat diterima / For side module or dress panel, left and right side if carcass scratch that is still visible within the distance of 1 arm-length (700mm) is not acceptable	✓	
7	Untuk bintik/noda yang terdapat pada bagian side modul hanya bias diterima 3 titik saja dan maksimum lebar 1 mm. For spots / stains found on the side of the module, only 3 points can be raccepted and a maximum width of 1 mm.	✓	
8	Dent/bengkok yang masih terlihat pada jarak 700 mm tidak dapat diterima. Dent / bent that is still visible at a distance of 700 mm is not acceptable.	✓	
C. Part: Back Module/ Carcass and Top Module/Carcass			
9	Untuk bagian Back modul dan Top modul goresan halus bisa diterima hanya 3 titik saja dan panjang maksimum masing-masing adalah 20 mm For the Back module and Top modules the fine scratches can be received in only 3 points and the maximum length of each is 20 mm	✓	
10	Untuk goresan kasar yang masih kelihatan pada jarak 700 mm hanya dapat diterima 1 titik saja dan maksimum panjang adalah 10 mm saja. For rough scratches that are still visible at a distance of 700 mm only 1 point can be received and the maximum length is 10 mm.	✓	
11	Untuk bintik/noda pada bagian Back modul dan Top modul hanya dapat diterima 3 titik saja dan maksimum lebar adalah 3 mm. For spots / spots on the Back module and Top modules only 3 points can be accepted and the maximum width is 3 mm.	✓	
12	Untuk bagian depan front panel powder yang terlalu tipis harus di tolak dan dilakukan powder ulang sampai mendapatkan hasil yang bagus For the back of the front panel, if the powder is too thin, to be rejected and the powder is repeated until get the good results	✓	
D. Bagian bawah/Bottom part (support stand joint area)			
13	Periksa apakah posisi nurtsert sudah tepat atau belum. Nurtserts harus benar-benar lurus Check all nutsert position if slanted or not. Nutserts must be fully straight.	✓	
E. Semua Bagian / All Parts			
14	Periksa apakah keseluruhan part yang akan dipowder memiliki karat atau tidak. Jika ada, maka akan dilakukan proses Buffing atau Grinda terlebih dahulu sebelum dipowder. Check whether the entire part to be powder-coated has any rust. If there is any, the part will undergo a Buffing or Grinding process first before being powder-coated.	✓	
Instrumen yang Digunakan / Instrument Used			
1	Thickness Gauge (Positector)	Serial Number: <u>879F01/440001</u>	Equipment Number: <u>BQP-PC-005</u>

Checked by: 204
 Date: 14-01-26

ESC®
CENTURION CONTROLLER (G4) & RETROFIT KITS ELECTRICAL QC INSPECTION FORM

INSPECTION DATE: 21-Jan-2024 PR WEEK: 05
EP ASSEMBLER: Marcel ; EP-1004/20

FORE TURNING ON THE CABINET

- Pengantarannya!**
- Ukur tegangan dengan volt meter dari / Measure voltage with
voltage of:
- Phasa-Netral / Live-Neutral : 230V/15 / 115V/15 / 100V / 15.
- Hasil/ Result: 93
- Phasa-Ground / Live-ground : 230V/15 / 115V/15 / 100V/15.
- Hasil/ Result: 98
- Netral-Ground / Neutral-ground : 0 V.
- Hasil/ Result: 0,4
- Kontak Relay Alarm dan Exhaust terpasang dengan posisi yang benar, stiker harus lengkap, dan ukur dengan ohmmeter pada terminal kontak relay / The Alarm relay contact and Exhaust relay contact correctly installed, the stickers must be complete and merge by ohmmeter on the Terminal Relay Contact.
- Ketika tombol Kipas Blower di tekan ON/OFF, Kontak relay Exhaust akan terkonek/terputus. When pressing keypad of fan blower ON/OFF, the Exhaust relay contact will connected/unconnected.
- Pastikan Blower berambus/ Make sure the Blower is blow CM/CW WUP/DOWN
- CODE: _____ DATE _____
- S/N of N1 Motor: 6-eo901.85MP 10Q
- S/N of Blower: 180 - 179
- S/N of N2 Motor: _____
- S/N of Blower: _____
- Gesekan pada cabinet tidak berlebihan/ Vibration on cabinet not excessive (pada duty cycle: 80 %)
- Pengukur kecepatan bekerja/ Speed control work. (blower harus merespon ketika pengatur kecepatannya dalam dan level status) gear/h naik normal atau turun saat pengatur kecepatannya di atur. Blower must respond when speed control is adjusted and fan rotate level normally increase or decrease while speed control is controlled)

AIRFLOW SENSOR			
W	Sensor	Down Flow	Up Flow
S/N:	Rev:	Constant:	
Zero:	Vdc:	Fail:	Vdc: Nominal:
Sensor Exhaust Bekeja/ Exhaust Sensor work			
S/N:	2016 - 80582 - 1002021 - R23		Constant:
Zero: 0.000Vdc	Fail: 3.21 Vdc	Nominal: 5.283Vdc	Max: 7.93Vdc
☒	Sensor suhu bekeja/ Temperature Sensor work. Tegangan		
Nominal/ Nominal Voltage: (0.25)			

- ☒ Pastikan power outlet dimatikan sebelum pemasangan power cord ke unit. (Unluk menghindari langsung pasang)/ *Ensure the power outlet is switched off before plugging the power cord to the unit. (to prevent Hot Plugging)*
- ☒ Pastikan unit sudah upgretki 2/ Ensure cabinet already upgretki 2
- LANGKAH 2/STEP 2. SELANG UNIT HIDUP (TOLONG CERAHANG LITAGANGANNYA/ WHILE TURNING ON THE CABINET PLEASE CHECK THE VOLTAGE RATING)**

- ✓ Saklar magnet FULLY OPEN bekerja. Ketika active, LCD akan menampilkan FULLY OPEN & alarm menyala (telingan ok dan needs bekerja). Magnet switch FULLY OPEN work. When i active, LCD will display FULLY OPEN & alarm on (Mute ok and needs work).

- | | |
|-------------------------------------|--|
| ☒ | Pastikan Saklar magnet NORMA/ HEIGHT bekerja. Ketika aktif, lampu menyala otomatis & alarm mati. |
| ☒ | Pastikan saklar magnet standby bekerja ketika aktif. LCD menampilkan STANDBY MODE. |
| ☒ | Pastikan micro switch front panel (57) bekerja ketika front panel di tutup alarm otomatis mati (khusus unit EU). |
| ☒ | Pastikan micro switch motorized (56) bekerja ketika aktif motorize secara otomatis berputar keatas (khusus unit EU) |
| ☒ | Pastikan LED relay board untuk masing masing magnets switch berfungsi ketika masing masing magnets switch aktif led pada relay berfungsi. |
| ☒ | Lampu LED Bekerja/LED LIGHT work.
1081409 / 1081410 / 1081423 / 1081408(for 5ft only) |
| ☒ | Pastikan Saklar magnet UV MODE Bekerja. Ketika aktif, LCD akan menampilkan UV MODE & lampu UV dapat dinyalakan. / Make sure the UV MODE magnets switch work. When it active, LCD will display UV MODE & UV lamp can be ON. |
| ☒ | Lampu UV harus Bekerja/UV lamp must be work.
1080219(for 3ft) / 1080223(for 5,6ft) |
| | Kunci dari Solenoid bekerja / Key lock and solenoid work. |

The jumper pins on the sub-board are fixed in the correct location, refer to Electrical layout.

↳ komunikasi tiap sub-papan dengan mainboard termonitor dan merespon dengan baik. Status kesetruhan sub-papan termonitor pada halaman Diagnostik dengan awalan nama "Module". Communication of each sub-board with the mainboard is monitored and responds well. Sub-board status monitored in Diagnostic page with "Module" as initial name.

☒ Papen terminasi sub-board terpasang dengan baik, biasanya terlekat di Hybrid Digital board.

☒ Terminal board of sub-board installed well, usually placed on Hybrid Digital board.

☒ Kualitas suara buzzer bagus.

M Sensor limit switch panel depan terbuka bekerja dengan baik (hanya unit LA2 EU).

limit switch sensor of Front Panel opened is working well (only for LA2 EU).

☒ USB port dapat bekerja dengan baik dan dapat mendeteksi perangkat penyimpanan yang terkoneksi.

The USB port works well and can detect connected storage devices. The RBM blower interface mode harus benar, yaitu Digital Serial Interface (DSI) mode (kecuali unit SC2). The RBM blower interface mode must be correct, i.e. DSI mode (except SC2 unit).

☒ Duty cycle dan RPM blower dapat termonitor dengan baik, hanya untuk kabinet yang menggunakan jenis blower RBM. Duty cycle and blower RPM can be monitored properly, only for cabinet that use RBM blower.

✓ Layar terkunci akan ditampilkan jika layar tidak disentuh dalam beberapa saat.

☒ Akun pengguna default berfungsi dapat digunakan untuk login (operator, admin, supervisor, service, dan factory).
The default user account function can be used to log in (operator, admin, supervisor, service, and factory).

☒ Semua tombol pada home screen dapat bekerja dengan baik (Menu, Fan, Light, Socket, Gas, UV, Mute, WiFi,)

☒ Menu Experiment Timer dapat berfungsi dengan baik.

Experiment Timer menu function well.

☒ Intensitas Chaya lampu dapat diatur pada menu Light intensity
Light intensity is adjustable in Light intensity menu.

☒ Tingkat ketelitian LCD dapat diatur pada menu LCD Brightness is adjustable in LCD menu.

☒ Bahasa yang digunakan pada display sesuai dengan Bahasa yang terpilih pada menu Language.

The language used on the display corresponds to the language selected on the language menu.

disalin ke perangkat penyimpanan USB (format FAT/FAT32).
 Ensure Booking Schedule feature (In Booking Schedule menu)
 function, and the data able to be exported to PDF file and copied to
 (in USB flash drive (FAT/FAT32 format))

☒ Pastikan Halaman Diagnostic menampilkan kondisi umum terki-
dal kabinet (versi software, SN, mode, ssh, fan, filter & UV lite
suhu, exhaust & alarm kontak, magnet switch, dan module) da-
parameter kalibrasi.

Ensure Diagnostic page contains current general condition of the cabinet (software version, SN, mode, sash, fan, filter & UV life, exhaust & alarm contact, magnet switch, and module) and calibration parameters.

ESCO CENTURION CONTROLLER (G4) & RETROFIT KITS ELECTRICAL QC INSPECTION FORM

- ☒ Pastikan fitur Data Logging, Alarm Logging, and Event Logging (pada menu Data Log, Alarm Log dan Event Log) berfungsi, dan datanya dapat diexport dalam bentuk file PDF dan disalin ke perangkat penyimpanan USB (format FAT/FAT32).
- ☒ Ensure Data Logging, Alarm Logging, and Event Logging feature (in Data Log, Alarm Log and Event Log menu) function, and the data able to be exported to PDF file and copied to on USB flash drive (FAT/FAT32 format).
- ☒ UV Timer dapat diatur pada menu UV Timer dan dapat berfungsi dengan baik saat UV dihidupkan pada layer utama.
- ☒ UV Timer can be set in UV Timer menu, and function well when UV is activated at Home Screen.
- ☒ Fitur WiFi bekerja dengan baik, atau dapat terhubung dengan suatu jaringan (cek pada menu Network).
- ☒ WiFi feature works well, or able to be connected to a network.
- ☒ Check Network menu.
- ☒ Mute Timer dapat diatur pada menu Mute Timer dan dapat berfungsi dengan baik saat tombol Mute pada layer utama ditekan.
- ☒ Mute Timer can be set in the Mute Timer menu and works properly when the mute button on the Home Screen is pressed.
- ☒ Tombol Shutdown dapat berfungsi dengan baik pada menu Shut down. Senjema perangkat akan dinatkan jika shut down telah dilakukan.
- ☒ The Shutdown button works fine on the Shutdown menu. All devices will be turned off once the shutdown has been performed.
- ☒ Pastikan penutupan, penambahan, dan penghapusan akun pengguna pada menu User dapat dilakukan.
- ☒ Make sure changes, additions, and deletions of user accounts on the Users menu can be performed.
- ☒ Pengaturan nama kabinet pada Cabinet name dapat dilakukan dan ditampilkan pada layer utama.
- ☒ Cabinet name settings on the Cabinet Name menu can be done and displayed on the Home Screen.
- ☒ Pengaturan zona waktu, tanggal, dan waktu dapat dilakukan secara berurutan pada menu Time Zone, Date, dan Time.
- ☒ The time zone, date and time setting can be done sequentially on the Time Zone, Date, and Time menus.
- ☒ Pin untuk menghubungkan Fan dapat diatur pada menu Fan PIN, dan PIN akan dinimna ketika akan menghubungkan Fan, jika ini telah diatur.
- ☒ PIN to turn on the Fan can be set in the Fan PIN menu, and the PIN will be asked when the user will turn on the Fan, this is valid only if the setting has been set.
- ☒ Mode operasi kabinet (Normal, Quick Start, dan Maintenance) dapat dipilih pada menu Operation Mode, dan dapat berfungsi dengan baik.
- ☒ The operating mode of the cabinet (Normal, Quick Start, and Maintenance) can be selected in the Operation Mode menu, and can function properly.
- ☒ Fungsi pemantauan nilai airflow dapat diatur pada menu Airflow Monitor. Airflow alarm akan dinatkan dan nilai airflow tidak diperlihatkan pada layer utama jika parameter ini di-Disable.
- ☒ The airflow value monitoring function can be set in the Airflow Monitor menu. The airflow alarm will be turned off and the airflow value will not be shown on the main layer if this parameter is disabled.
- ☒ Waktu warming up dan post purging dapat diatur secara berurutan pada menu Warmup Time dan Post Purge Time. Pastikan waktu tersebut dapat berfungsi dengan baik.
- ☒ Warmup Time and post purging can be set sequentially on the Warmup Time and Post Purge Time menus. Make sure the timing is working properly.
- ☒ Tingkat keamanan akses (Minimum, Moderate, dan Secure) dapat dipilih pada menu Security Access Level dan dapat berfungsi dengan baik.

ESCO CENTURION CONTROLLER (G4) & RETROFIT KITS ELECTRICAL QC INSPECTION FORM

- ☒ Minimum: Kelompok menu User dapat diakses, tombol Fan, Light, Socket, Gas, UV dan Mute dapat diakses.
- ☒ Moderate: Tombol Fan, Light, Socket, Gas, UV dan Mute dapat diakses.
- ☒ Secure: Menu, tombol Fan, Light, Socket, Gas, UV, dan Mute tidak dapat diakses.
- ☒ Access security level (Minimum, Moderate, and Secure) can be selected in the Security Access Level menu and can function properly.
- ☒ Minimum: User menu group accessible, Fan, Light, Socket, Gas, UV and Mute buttons accessible
- ☒ Moderate: Fan, Light, Socket, Gas, UV and Mute buttons are accessible.
- ☒ Secure: Menu, Fan, Light, Socket, Gas, UV and Mute buttons cannot be accessed.
- ☒ Fan Duty cycle dapat diatur pada menu Fan Speed.
- ☒ Fan Duty cycle can be set in the Fan Speed menu.
- ☒ Satuan pengukuran (Metric/Imperial) dapat dipilih pada menu Measurement Unit, dan dapat berfungsi dengan baik.
- ☒ The unit of measurement (Metric/Imperial) can be selected in the Measurement Unit menu, and it function well.
- ☒ Kalibrasi sensor dapat berfungsi dengan baik pada menu Full Sensor Calibration untuk kalibrasi pabrik, dan Field Sensor Calibration untuk kalibrasi di tempat customer.
- ☒ Sensor calibration function properly in the Full Sensor Calibration menu for factory calibration, and Field Sensor Calibration menu for calibration at the customer's site.
- ☒ Sensor sensor pressure untuk kabinet LB2 dan LCI dapat dilakukan pada menu Built-in SEAS Alarm menu.
- ☒ Pressure sensor setpoint for LB2 and LCI cabinet can be done on the Built-in SEAS Alarm menu.
- ☒ Pengaturan tanggal peringatan sertifikasi dapat diatur pada menu Certification Reminder. Notifikasi peringatan ditampilkan pada layer utama.
- ☒ The certification reminder date can be set in the Certification Reminder menu. Reminder notifications are displayed on the Home Screen.
- ☒ Laporan sertifikasi dapat dilihat pada menu Certification Summary, dan dapat dicetak ke printer server.
- ☒ The certification report displayed in the Certification Summary menu, and able to be printed to the printer server.
- ☒ Nilai Filter Life, Fan usage, UV Life, dan Saah cycle (untuk unit yang menggunakan saah motorize) dapat direset melalui menu Reset Parameters.
- ☒ Filter Life, Fan usage, UV Life, and Saah Cycle values (for units that use Saah Motorize) can be reset through the Reset Parameters menu.
- ☒ Halaman Software update dapat diakses, melalui menu Software Update -> Tombol Next -> Tombol OK.
- ☒ The Software update page can be accessed, through the Software Update menu -> Next button -> OK button.
- ☒ Pastikan Serial Number unit diatur pada menu Serial Number.
- ☒ Ensure the Serial Number unit is set in the Serial Number menu.
- ☒ Batas suhu operasi kabinet dapat diatur pada menu Environmental Temperature Limit, dan dapat berfungsi dengan baik.
- ☒ Pengaturan Enable/Disable ESCO Lock Service PIN dapat diatur pada menu ESCO Lock Service (default: Disable). PIN akan 'service' dan 'factory' akan berubah secara otomatis untuk setiap minggunya, dan terkalkulasi dari serial number yang telah diat dan waktu dan tanggal saat ini.
- ☒ The Escro Lock Service PIN Enable/Disable setting can be set in ESCO Lock Service menu (default: Disable). The 'service' and 'factory' account PINs will change automatically every week, and are calculated from the predefined serial number and the current time and date.
- ☒ Fitur tambahan seperti Built-in SEAS, Saas Flap, Motorize Saah, UV Lamp, Gas Valve, Electrical Socket dan Particle Counter Sensor dapat diaktifkan dan tidak diaktifkan melalui menu Auxiliary function. Pastikan fitur tambahan yang diaktifkan sesuai dengan kebutuhan kabinet.
- ☒ Additional features such as Built-in SEAS, Saas Flap, Motorize Saah, UV Lamp, Gas Valve, Electrical Socket and Particle Counter Sensor can be activated and deactivated through the Auxiliary Function menu. Ensure the additional features that are activated match the needs of the cabinet.
- ☒ Pilihan model kabinet dapat dipilih melalui menu Cabinet Model. Pastikan kabinet model yang terpilih sesuai dengan model kabinet aktual.
- ☒ Cabinet model options can be selected through the Cabinet Model menu. Ensure the selected cabinet model matches the actual cabinet model.
- ☒ RTC Watchdog berfungsi dengan baik. Penghitung mundur akan selalu direset ke angka 60 jika RTC Watchdog berfungsi dengan normal.
- ☒ RTC Watchdog works fine. The countdown counter will always reset to 60 if the RTC Watchdog is functioning normally.
- ☒ System informasi dari prosesor yang digunakan ditampilkan pada menu System Information.
- ☒ System information of the processor used is displayed on the System Information menu.
- ☒ CORDESL
- ☒ Tipe dari cord set (A/B/C/D/E/F/G/H/I/J No cord set)
- ☒ ELECTRICAL OUTLET
- ☒ Koneksi electrical outlet benar. (Catatan: Pin satu yaitu dengan tanda strip)/The electrical outlet connections are correct (Note: Pin one is with strip mark)
- ☒ Pin 1 is LIVE (Brown), Pin 2 is NEUTRAL (Blue), Pin 3 is GROUND (Yellow Green)
- ☒ Indikator GFCL menyala (Kuning dan kuning adalah posisi yang benar) / GFCL indicators ON (Yellow and Yellow are the correct position)
- ☒ Ukur tegangan pada electrical outlet/ Measured voltage on electrical outlet:

Measured	1 st	2 nd	3 rd	4 th	5 th	6 th	7 th	8 th
	91.7	91.7	91.7	91.7	91.7	91.7	91.7	91.7
	Vac	Vac	Vac	Vac	Vac	Vac	Vac	Vac
	91.7	91.7	91.7	91.7	91.7	91.7	91.7	91.7
	Vac	Vac	Vac	Vac	Vac	Vac	Vac	Vac
	91.7	91.7	91.7	91.7	91.7	91.7	91.7	91.7
	Vac	Vac	Vac	Vac	Vac	Vac	Vac	Vac
	91.7	91.7	91.7	91.7	91.7	91.7	91.7	91.7
	Vac	Vac	Vac	Vac	Vac	Vac	Vac	Vac

- ☒ Tegangan outlet nol ketika dinatkan outletnya (ukur dengan multimeter). Voltage outlet zero when turning off the outlet (Measure with multimeter)
- ☒ Tipe outlet/Type of outlet: A/B/C/D/E/F/G/H/I/J (GFCL) Unw / JP / Ex-Prool / No outlet
- ☒ Jumlah outlet di unit harus sesuai dengan W/O (Qty Et-Outlet on the unit must match with W/O. 2 Pcs)
- ☒ Outlet terpasang dengan benar dan semua koneksinya kencang./ Outlet wired properly & All connection tight
- ☒ Warna kabel/ Color of wires:
- ☒ Phase/ Live : Hitam/Black / Merah/Red / Kuning/Brown
- ☒ Neutral/ Neutral : Putih/White / Biru/Blue
- ☒ Grounding/ Earth : Hijau/Green / Kuning/Kuning Yellow

RESULT: PASS / FAIL

WATT	AMPERE	FREQUENCY
		50 HZ / 60 HZ
		50 HZ / 60 HZ
CONFIRMASI tampilan pengukuran electrical safety analyzer / Confirmation Display Setting Electrical Safety Analyzer		
SPEKIFIKASI / SPECIFICATION	TAMPAKAN / DISPLAY	
MODE	SOURCE	LIMIT
ES	25.00	100.0
DC	1.200	10.00
IR	0.700	20.00

Note: Setiap unit harus di test Keselamatan Kelistrikan.
Every unit must be tested for Electrical Safety

FORMULIR PEMERIKSAAN QC ELEKTRIKAL PANEL / ELECTRICAL PANEL QC INSPECTION FORM

Formulir QC ini diisi secara permanen dengan departemen Elektrikal QC. Tiap panel / kabinet harus memiliki nomor seri
This QC record form is to be filed permanently with the Electrical QC department. Each cabinet/panel must have a serial number.

JO : 219690 CABINET SN: 2046-49690 TANGGAL / DATE : 19-Jan-2018

POWER SUPPLY : 100-110-120/230-240 V AC, 50/60 Hz

MODEL : EP AG-NL-69 (PC)

NAME OF INSPECTOR : Daman

PANEL SERIAL NO : EP - 1009 / 26

Catatan: Bubuhi tanda ✓ pada kolom lulus atau gagal / Note: Tick ✓ on Pass or Fail column

No	PEMERIKSAAN QC ELEKTRIKAL PANEL / ELECTRICAL PANEL QC INSPECTION	Pass	Fail
1	Apakah panel telah lulus uji? / Has the panel passed the test?	✓	
2	Pilih rating yang benar untuk ballast? / Choose the correct rating for ballast? Fluorescent: WHSG4-UNV-T8-IS, EBS236 (Phillips), ICN- 2P32-SC, WH5-230-L, ICN-4P32-SC, FH01-230-228T5-L, FH01-230-221-T5-L, WH5-120-L, WH4-120-L, WH6-120-L, EKE-32100AB1-P, EKE-40100AB1-P <u>Trimlux 0700-90</u> Model: Batch Number / Nomer batch: _____ UV EBP30, EBU120, WH3-230-L, <u>WH-33-120-L</u>, EKF-15100AB1-P Tridonic Ballast Batch Number / Nomer batch: _____	✓	
3	Pilih rating yang benar untuk relay? / Choose the correct rating for relay? Rating : 100 V / 110 V / 220 V / No Relay 12 Vdc : LY2-D (Omron) / JQX-13F/012-2Z1D (Xiamen Hongfa)	✓	
4	Pilih rating yang benar untuk MCB? / Choose the correct rating for MCB? MCB A : 3A / 4A / 6A / <u>10A</u> / 16A / No MCB In Cabinet	✓	
5	Pilih rating yang benar untuk Noise Filter? / Choose the correct rating for Noise Filter (EMI Filter)? Noise Filter : 6A / 10A / <u>16A</u> / No Noise Filter In Cabinet	✓	
6	Tipe yang benar dari speed control? / Correct type of speed control? Type: NoSpCtrl/KBWC26R/KBWC15R/Hoffman 10A/PAE10E/Potentiometer In Cabinet MSC1200B/MSR 2000A/PCSL5H/Accuflow R3/Accuflow G2/Stable Flow/ECMS <u>PCSL</u> Harap ukur titik Uji Motor / Please Measured the Motor Test : Minimum voltage: _____ Volt Maximum Voltage: _____ Volt Catatan : Untuk Accuflow Rev 3, pastikan saat kita menekan tombol kalibrasi, indikator merah akan menyala, saat kita menekan tombol reset, kedua indikator merah dan hijau akan menyala secara berturut - turut Note : For Accuflow Rev 3 please make sure when we press the calibrate push button the red indicator will on , when we press the reset push button, both the red and green indicator will turn on simultaneously.	✓	
7	Untuk kontrol kecepatan PCSL-5H, apakah permukaan knob mulus? Silahkan putar potensio dan ukur bahwa hambatan antara lead 1 dan 2 berubah dari 0 ke 1 MOhm For PCSL-5H speed control, is knob surface smooth? Pls turn potentio and measure that the resistance between lead 1 and 2 is changed from 0 to 1 MOhm.	✓	
8	Untuk speed control Accuflow Revisi 3, apakah fuse dipasang ke holder fuse dengan ketat? / For Accuflow Rev.3 speed control, is the fuse fitted to the fuse holder tightly? Silahkan lakukan pemeriksaan visual apakah pegangan holder fuse ketat. / Please do visual check whether the fuse holder grip is tight. Catatan : Untuk Accuflow Rev 3, pastikan saat kita menekan tombol kalibrasi, indikator merah akan menyala, saat kita menekan tombol reset, kedua indikator merah dan hijau akan menyala secara berturut - turut Note : For Accuflow Rev 3 please make sure when we press the calibrate push button the red indicator will on , when we press the reset push button, both the red and green indicator will turn on simultaneously.	✓	
9	Apakah stiker "Motor Voltage Test" terpasang? / Is the "Motor Voltage Test" sticker installed? Harap ukur titik Uji Motor / Please Measured the Motor Test: Minimum voltage: _____ Volt Maximum Voltage: _____ Volt	✓	
10	Apakah label panel benar - benar menempel? Tidak ada bagian yang terkelupas? / Is the panel label properly pasted? No part is peeled?	✓	
11	Tipe yang benar dari Mikroprosesor? / Correct type of Microprocessor? Type: No MP /C-Series /S-Series /T-Series SET Number : _____ S/N of Relay Board : _____ Rev : _____	✓	
12	Nilai yang benar untuk Kapasitor (uF)? / Correct value of Capacitor (uF)? Nilai / Value: 1.5 / 2 / 2.5 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 10 / 12 / 14 / 20 / 25 / 30 / 32 / 40 / 100	✓	
13	Pelabelan yang benar untuk konektor dan part (Mengacu pada gambar elektrikal) Correct labeling for connectors and part? (Refer to electrical drawing)	✓	
14	Kabel ground menempel pada plat panel? / Ground cable attached to the panel plate?	✓	
15	Semua koneksi ketat dan part elektrikal terpasang kuat / Posisikan panel terbalik agar benda metal/plastik dan kabel bekas terbang. All connections tight and mounting electrical part strong? Please shake the panel to remove any metal/plastic or cable scrap.	✓	
16	Apakah panel bersih dan tidak ada sudut yang tajam? / Is the panel clean and has no sharp edge?	✓	
17	Apakah kipas terpasang? (Hanya untuk panel tertentu) / Is the fan installed? (Only for certain panel)	✓	
18	Menggunakan multimeter, periksa sambungan dengan menghubungkan terminal positif & negatif pada blok terminal X10. Using a multimeter, check connectivity by connecting positive & negative on X10 terminal block. Jika berbunyi, tolak dan cari koneksi kabel yang salah If it buzz, reject and look for the wrong wiring connection.	✓	
19	Setelah pengujian panel elektrikal selesai, ambil fuse untuk Lampu UV dari panel (untuk unit AVC-_D,AHC-_D dan SC2) dan masukkan kedalam kantong plastik kecil (hanya untuk AVD-XD2) After electrical panel testing is completed, take the fuse for the UV Lamp from the panel (for unit AVC-_D,AHC-_D, and SC2) and put inside small plastic bag (for AVC-XD2 only)	✓	
20	Pastikan fuse di papan relay pada LS-4 menggunakan fuse 2A (untuk semua VDA dan ACS-DS4) Make sure the fuse in the relay board on LS-4 is fuse 2A (for all VDA and ACS-DS4)	✓	

HASIL : LULUS GAGAL
RESULT : PASS / FAIL

FORMULIR PENGUJIAN ELEKTRIKAL PANEL dan QC INSPEKSI
ELECTRICAL PANEL TESTING and QC INSPECTION FORM

FORMULIR PENGUJIAN ELEKTRIKAL PANEL / ELECTRICAL PANEL TESTING FORM

Formulir Pengujian ini diisi secara permanen oleh Tester Elektrikal Panel / Tiap panel/kabinet harus memiliki nomor seri.

This testing form is to be filed permanently by Electrical Panel Tester / Each cabinet/panel must have a serial number.

JO : <u>29690</u>	CABINET SN: 20 <u>25</u> - <u>29690</u>	TANGGAL / DATE : <u>19</u> - <u>Jan</u> 20 <u>22</u>
MODEL : EP	<u>AP2 - M2-89</u> <u>CP2</u>	POWER SUPPLY : 100/110-120/220-240 VAC <u>50/60</u> Hz
DIPERIKSA OLEH/CHECKED BY : <u>Darmas</u>		PANEL SERIAL NO : EP <u>1004</u> / <u>26</u>

SEBELUM UJI FUNGSIONAL / BEFORE FUNCTION TEST

Bubuhi tanda ✓ pada kolom ya, tidak atau NA / Note: Tick ✓ on Yes, No or NA column

No	PENGUJIAN ELEKTRIKAL PANEL / ELECTRICAL PANEL TESTING	YES	NO	NA
1	Berapa rating tegangan? / What is the voltage rating?			
	100V / <u>110V</u> / 120V / 220V / 230V / 240V			
2	Apakah semua komponen sudah dengan tegangan yang benar? <i>Are all components with correct voltage?</i>	✓		
3	Apakah semua Label dan koneksi benar, kencang, serta pemasangan part electricalnya Kencang? <i>Are all label and connections correct, tight, and also mounting electrical part strong?</i>	✓		
4	Apakah panel sudah dengan kabel grounding? / Is the panel with earth cable?	✓		

UJI FUNGSIONAL / FUNCTION TEST

Catatan: Bubuhi tanda ✓ pada kolom ya, tidak atau NA / Note: Tick ✓ on Yes, No or NA column

No	PENGUJIAN ELEKTRIKAL PANEL / ELECTRICAL PANEL TESTING	Yes	NO	NA
1	Pastikan semua kabel tersambung dengan benar sebelum menyalakan panel. (Power ke Main Board, ke relay board, ke sensor, output dari SMPS, dll). Periksa dan lihat ke Gambar Elektrikal. Silahkan tambahkan stiker. <i>Please make sure all connection cables with correctly before switch on (Power to main board, to relay board, to sensor, output from SMPS, etc). Check and refer to Electrical Drawing. Please add the sticker.</i>	✓		
2	Apakah lampu fluorescent bekerja? / Does fluorescent lamp work?	✓		
3	Apakah lampu UV bekerja? / Does UV lamp work?	✓		
4	Apakah blower bekerja? / Does blower work?	✓		
5	Lakukan adjust dengan beberapa variant tegangan. Apakah blower merespon? <i>Adjust in various voltage, is the blower responding?</i>			
6	Apakah kontak Zero Free Relay untuk exhaust blower bekerja? (periksa dengan continuity meter) <i>Does connection Zero Free Relay Contact for exhaust blower work?(Check with continuity multi meter)</i> (Implement ke unit yang menggunakan Kontak Zero Free Relay / Implement to unit used the Zero Free relay contact) (LB2-xY7, LA2-xY7 Gen 2, LA2-3,5,6N7, LB2-E series and LA2-E series)			✓
	Zero Free Relay Blower berfungsi = Ada sambungan Zero Free Relay Blower Function = Has connectivity			
	Kontak Zero Relay Blower tidak berfungsi = Tidak ada sambungan Zero Relay Contact Blower Not function = No connectivity			
7	Apakah saklar magnetik bekerja? / Does magnetic switch work?	✓		
8	Apakah outlet bekerja? / Does outlet work?	✓		
9	Apakah kabel dari sensor benar terhubung? / Does cable from Sensor right connected? (Kuning ke AIN 1, Hitam ke J1, Biru ke J4 / Yellow to AIN 1, Black to J1, Blue to J4)			✓
10	Apakah buzzer (bel) berfungsi dengan baik? / is the buzzer function well?	✓		
11	Apakah tipe software sudah benar? (Harus sesuai dengan tipe kabinet) <i>Is the software type correct? (Must match with the cabinet type)</i> Tipe / Type: _____			✓
12	Apakah software sudah divalidasi? / is the software validated? (Lihat pada sticker, "Val:" ada cheknya/Look on the sticker, the "Val:" is has Checked)			✓
13	Apakah softwarenya prototipe pertama/ customize/ standar (Lihat pada sticker software yang dilingkari P/S/C) <i>Is the software the first prototype/Customize/Standard? (See on the software sticker it has circle P/S/C)</i>			✓
14	Pengujian (Seri -T / Seri - C/Series-S/Series-U) / (T-Series /C-Series/S-Series/U-series) Test Apakah elektrikal panel lulus uji Seri - T/Seri - C/Series-S/Series-U? <i>The electrical panel pass T-Series Test/C-Series/S-Series/U-Series Test?</i>			✓
15	Uji SMPS / SMPS Test Output Tegangan / Voltage Output: <u>12Vdc</u> SN: <u>SC 5004 6002</u> 12V w/ ±0.2 tolerance	✓		
16	Uji SMPS hanya untuk UUS-A / SMPS Test For UUS-A Only (Sesuaikan output tegangan SMPS sampai 13,5Vdc / Adjust Voltage Output SMPS to 13.5 Vdc). Output tegangan/Vout: _____ Vdc (Acceptance Range 13-14VDC±0.2)			✓
17	Apakah Relay K1 bekerja? (Hanya untuk UUS-A) / Does Relay K1 workly? (For UUS-A Only)			✓
18	Apakah Relay K2 bekerja? (Hanya untuk UUS-A) / Does Relay K2 workly? (For UUS-A Only)			✓
19	Apakah kontrol kecepatan KBWC-26R bisa disesuaikan ke 100 Volt (Untuk SPD/PW1)? <i>Can the Speed control KBWC-26R be adjusted to ≤ 100 Volt (For SPD/PW1)?</i>			✓
20	Apakah kontrol kecepatan KBWC-15R bisa disesuaikan ke 50 Volt (Untuk SPD/PW2)? <i>Can the Speed control KBWC-15R be adjusted to ≤ 50 Volt (For SPD/PW2)?</i>			✓
21	Pastikan pembacaan duty cycle di LCD sama atau ± 2 Point dengan pembacaan di ECMS? (Untuk AC2-TU) <i>Ensure the duty cycle reading on the LCD the same or ± 2 Point as the reading on the ECMS? (For AC2-TU)</i>			✓
22	Apakah kabel UTP terkoneksi dengan baik? (Hanya untuk EC2,CCL, CLS, dan UUS) <i>is the UTP cable connected well? (For EC2, CCL, CLS, and UUS- Only)</i> Periksa koneksi saklar Tekanan HUBA menggunakan Continuity meter untuk Pin 1 dan Pin2 adalah NC,lalu Pin 1 dan Pin 3 NO. Apakah fungsinya benar? (Hanya untuk model LB2-xBy G2, LB2-xBy-E, LB2-xY7 G2) <i>Check connection of Huba Pressure Switch using continuity meter for Pin 1 and Pin 2 is NC, then Pin 1 and Pin 3 is NO. (For Model LB2-xBy G2, LB2-xBy-E, LB2-xY7 G2 Only)</i>			✓

HASIL : LULUS / GAGAL
RESULT : PASS / FAIL

List Pengecekan Perakitan dan Panel Elektrikal PCB G4
Assembler and PCB Electrical Panel G4 Checklist

Tanggal/Date: 14/1/2026
 Electrical box/Panel Model: AC-4N7 G4
 Penginspeksi/ Inspector: [Signature]

JO : 219690
 Perakit panel / Assembler Panel: marcell
 Perkit PCB / Assembler PCB: Nur-k

PERHATIKAN PERBEDAAN MATERIAL UNIT 230V DAN 115V PAY ATTENTION TO THE DIFFERENCE IN MATERIALS BETWEEN THE 230V AND 115V UNITS.					
No.	Perakit Panel/ Panel Assembler	YES	NO	NA	
1	Apakah kualitas powder pada electrical box nya bagus, bersih dan tidak ada scratch pada semua sisinya? <i>Is the Quality of powder coating on electrical box is good, clean, there is no scratch on all side?</i>	✓			
2	Apakah semua mur di-dalam electrical box bebas dari karat? <i>Are screws inside electrical box free from rust?</i>	✓			
3	Apakah buzzer terpasang dengan benar pada electrical box ? <i>Buzzer installed correctly on electrical box ?</i>	✓			
4	Apakah semua kabel di-crimping dengan benar dan kuat? (Lakukan test tarik untuk semua kabel) <i>Are all wires crimped well? (Conduct pull-test for all wires)</i>	✓			
5	Berapa rating tegangan yang digunakan unit ? <u>115V/ 230V</u> <i>How is the voltage rating for unit ?</i>	✓			
6	Apakah semua komponen memiliki stiker tagging and terpasang di posisi yang tepat? <i>Are all components have sticker and installed in correct position?</i> (MCB, terminal bars, ground bars, UV ballast, LED driver, and speed control)	✓			
7	Apakah semua terminal bar terpasang dengan cover dan dalam kondisi yang bagus? <i>Are all terminal bars installed with the cover and good condition?</i>	✓			
8	Apakah semua label kabel benar dan berada di posisi yang terlihat jelas? <i>Is All cable label correct, and on position can be see?</i>	✓			
9	Untuk unit yang menggunakan speed control KBWC, pastikan lobang minimum setting sesuai dengan lobang pada breket speed control <i>For other units which used KBWC Speed control, make sure hole for minimum setting is compatible with hole at the speed control bracket.</i>				✓
10	Apakah Benar ratingnya untuk MCB/ Is Correct rating for MCB ? MCB A : 3A / 4A / 6A / 10A / 16A / No MCB	✓			
11	Apakah rating Noise filternya/ Is Correct rating for Noise Filter (EMI Filter) ? Noise Filter : 6A / 10A / 16A / No Noise Filter	✓			
12	Apakah benar tipe pengatur kecepatannya/ Is Correct type of speed control ? Type : No Sp Ctrl / KBWC26R / KBWC15R / RBM COM	✓			
13	Apakah benar nilai kapasitornya/ Is Correct value of Capacitor (uF)? Value : 1.5 / 2 / 2.5 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 10 / 12 / 14 / 20 / 25 / 30 / 32 / 40 / 100				✓
14	Apakah ballast terpasang dengan tipe yang benar/ Is the ballast installed with the correct type?(Refer to electrical drawing) LED Driver : T1M1UNV0500-30L, T1M1UNV0700-30L, T1M1UNV0900-40L, T1M1UNV1000-40L, T1M1UNV1400-60L, T1M1UNV140P-50L UV : WH3-230-L, WH-33-120-b, Tridonic Ballast	✓			
15	Pastikan hasil potongan strunking rapi, dan pemasangan strunking benar ? Sesuai dengan arus yang akan dilewati. Abu-abu untuk arus AC, Putih untuk arus DC <i>Make sure the results of strunking pieces are neat, and the installation of strunking is correct? In accordance with the current to be passed</i> <i>Gray for AC current, White for DC current.</i>	✓			
16	Lipat kabel output UV ballast ke arah atas panel dan kabel output LED driver ke arah bawah panel melalui strunking. <i>Fold the UV ballast output cable towards the top of the panel and the driver LED output cable towards the bottom of the panel via strunking</i>	✓			
No.	Perakit PCB/ PCB Assembler	YES	NO	NA	
1	Apakah kualitas powder pada penutup elbox nya bagus, bersih dan tidak ada scratch pada semua sisinya? <i>Is the Quality of powder coating on electrical box is good, clean, there is no scratch on all side?</i>	✓			
2	Apakah board HYBRID DIGITAL, PDB, Hybrid Analog, Pressure Transmitter, dan RBM terpasang dengan baik menggunakan PCB support ? <i>Are Relay Board and Main board mounted properly using PCB Support?</i>	✓			
3	Apakah board I2C sudah terpasang pada board Hybrid Digital ? <i>Is the I2C board installed on the Hybrid Digital board?</i>	✓			
4	Apakah jumper pada Hybrid analog dan Hybrid digital sudah terpasang dengan benar ? <i>Are the jumpers on the analog Hybrid and digital Hybrid installed correctly?</i>	✓			

List Pengecekan Perakitan dan Panel Elektrikal PCB G4
Assembler and PCB Electrical Panel G4 Checklist

No.	Perakit PCB/ PCB Assembler	YES	NO	NA
5	Apakah Sensor tekanan pada board pressure transmitter sesuai ? 500 Pa untuk LB2 <i>Is the pressure sensor on the pressure transmitter board compatible? 500Pa for LB2</i>			✓
6	Apakah Switch pada board Hybrid analog dan analog input sudah pada arah yang benar ? <i>Are the Switches on the Hybrid analog and analog input boards in the right direction?</i>	✓		
7	Apakah semua label kabel benar dan berada di posisi yang terlihat jelas ? <i>Is All cable label correct, and on position can be see?</i>	✓		
8	Apakah Flat kabel sudah terpasang dengan benar ? Pastikan tidak ada kabel yang tegang ! <i>Is the flat cable installed correctly? Make sure there are no strained wires !</i>	✓		
9	Apakah kabel USB sudah di pasang pada board RBM ? USB Port dan USB LCD <i>Has the USB cable been plugged into the RBM board? USB Port and USB LCD</i>	✓		
10	Apakah kabel magnetik switch sudah terpasang sesuai Electrical Drawing ? <i>Is the magnetic switch cable installed according to the Electrical Drawing?</i>	✓		
11	Apakah Cable no.114 sudah benar terpasang di HAB1-J101-Vo3 dan no.115 di HAB1-J101-GND ? <i>Is cable no.114 correctly connected to HAB1-J101-Vo3 and no.115 to HAB1-J101-GND?</i>	✓		
12	Pastikan kabel bagiari dalam panel sudah terkupas hingga batas terluar strungking (tidak melebihi strungking) <i>Make sure the cable inside the panel has been stripped to the outer limit of strungking (do not exceed strungking)</i>	✓		
14	Apakah semua mur untuk kabel pada PCB Board terkunci rapat? <i>Are all lock screw in PCB board tight?</i>	✓		
15	Apakah semua kabel terpasang dengan benar dan kuat pada board? (Lakukan test tarik untuk semua kabel) <i>Is All wire crimped tighten well in terminal on board? (Conduct pull-test for all wires)</i>	✓		
		RESULT : <u>PASS</u> / FAIL		

Touch Panel G4 Checklist

Tanggal / Date

: 14 Jan 2026
: AC2-UNIT G4 10"
: 219690

Prepared By

: GERTY.

Model

JO

No.	PEMERIKSAAN TOUCH PANEL / TOUCH PANEL QC INSPECTION	YES	NO	N/A
1	Apakah LCD yang digunakan sudah benar ? isi item code 1081458 Is the LCD used correct? fill in the item code	☒	☐	☐
2	Apakah LCD dalam keadaan bagus ? tidak ada retak dan scrach ? Is the LCD in good condition? no cracks and scratches ?	☒	☐	☐
3	Apakah SBC WiFi dalam keadaan bagus ? tidak ada tanda kerusakan Is SBC WiFi in good condition? no sign of damage	☒	☐	☐
4	Apakah Panhead M2,5 sudah terpasang di SBC WiFi , dan terkunci dengan kuat ? lakukan test Is the panhead M2.5 installed on the SBC WiFi, and locked firmly ? do a test	☒	☐	☐
5	Apakah Anthena sudah terpasang dengan benar di SBC WiFi ? Is the antenna installed correctly on the SBC WiFi ?	☒	☐	☐
6	Apakah micro SD sudah terpasang di SBC WiFi ? Is the micro SD installed on the SBC WiFi?	☒	☐	☐
7	Apakah Software yang terpasang sudah benar ? Isi ... Is the installed software correct? Fill in... SBC 103 - 1.2.3.1	☒	☐	☐
8	Apakah OS yang terpasang sudah benar ? Isi... Is the installed OS correct? Fill in... Bpr 74.1.0 - 1.0.2 - b.	☒	☐	☐
9	Apakah tegangan Baterai pada CTP Interface tidak kurang dari 3,2 Volt ? lakukan test dengan Multi Meter VBaterai = 3.45 Is the Battery voltage at the CTP Interface not less than 3.2 Volts ? do a test with a Multi Meter	☒	☐	☐
10	Apakah Kabel HDMI sudah terpasang dan dengan posisi yang benar ? Is the HDMI cable installed and in a good position?	☒	☐	☐
11	Apakah Flat Cable Touch screen terpasang dengan baik di J3 ctp interface ? tidak miring dan tidak terlepas Is the flat cable Touch screen installed properly on the J3 CTP interface ? not tilted and not separated	☒	☐	☐
12	Apakah Flat Cable Touch screen terpasang dengan baik di J4 CTP Interface ? tidak miring dan tidak terlepas Is the flat cable Touch screen installed properly on the J4 CTP Interface ? not tilted and not separated	☒	☐	☐
13	Apakah tampilan LCD dalam keadaan baik ketika dinyalakan? tidak blue screen, berbintik- bintik dan tidak mengecil ? Is the LCD display in good condition when turned on? not blue screen, grainy and not shrinking?	☒	☐	☐
14	Apakah layar LCD berfungsi dengan baik saat ditekan? Does the LCD screen function properly when pressed?	☒	☐	☐
15	Tempel Label QC PASS pada akrilik untuk menggaransi pemasangan LCD benar dan berfungsi dengan baik Stick the QC PASS label on the acrylic to guarantee that the LCD is installed correctly and functions properly	☒	☐	☐

RESULT : PASS / FAIL

QUALITY CONTROL CHECKLIST FOR AC2-NS G4 & AC2-N G4

WO: 2009150 JO: 219 690
Model: AC2-4V75910 Customer: JAPAW

SUB ASSEMBLY. PART A

Part: Module

- ☒ Kualitas powder coating pada module/ Powder coating quality on module
- ☒ Warna rata pada semua part/ Uniform colour on all parts
- ☒ Tidak ada goresan dan kotoran pada semua part/ No scratch and dirt on all parts
- ☒ Pastikan Jumlah tack weld di samping bagian belakang 3 titik/ Make sure the tack weld is on the back side at 3 points

Process: Applying white silicone to module

- ☒ Silicone dengan rapi semua bagian penyambungan welding, semua bagian persambungan antara inner liner dan cabinet, drain pan dan base modul, service fixture. / Silicone is neatly applied to all parts inside the module that has welding joints, connection between the inner liner and cabinet, drain pan and base module, service fixture.
- ☒ Pastikan semua kabel di dalam cabinet bagian ujungnya disilicone/ Make sure all the cables inside of cabinet, the edges are already silicon
- ☒ Pastikan kabel yang keluar dari cabinet disilicone untuk unit pressure test (AC2-NS, LA2, LB2)/ Make sure the cables coming out of the cabinet are siliconed, for unit pressure test (AC2-NS, LA2, LB2)

Part: Wiring for UV and electrical outlet

- ☒ Kabel UV dipasang dan diberi label dengan benar / Wiring for UV is correctly labeled and installed
- ☒ Pasang kabel UV lamp ke holder UV lamp dan pastikan sudah benar-benar kuat dan lakukan test Tarik/ Install the UV lamp cable to the UV lamp holder and ensure it is securely fastened. Then, perform a pull test.
- ☒ Kabel untuk outlet dipasang dan diberi label dengan benar / Wiring for outlet is correctly labeled and installed

Part: Complete nutserts for the following:

- ☒ Red cover (M5) ☒ Damper (M4) ☒ Profile (M5)
- ☒ Sensor (M4) ☒ Diffuser (M5) ☒ Outlet (M4)
- ☒ IV bar (M4)

Part: Bagian bawah/Bottom part (support stand joint area)

- ☒ Periksa apakah posisi nutsert sudah tepat atau belum. Nutserts harus benar-benar lurus / Check all nutsert position if slanted or not. Nutserts must be fully straight.

For AC2- S only part: Inner liner

- ☒ Plastik pelindung inner liner benar-benar utuh dan tidak ada goresan terlihat / The inner liner protective plastic is completely intact and there are no visible scratches
- ☒ Pastikan di inner liner ada lobang perforasi, kecuali unit AC2- K/ make sure the inner liner there is a perforation slots, Except AC2- K

Part: Drain pan

- ☒ Tidak ada dent (bengkok) dibagian drain pan / No dent can be found anywhere on the drain pan.
- ☒ Pastikan lobang di drain pan sudah center dan test dengan menggunakan drain valve/ Make sure the hole in the drain pan is centered and test it using the drain valve.

Part: Work Order

- ☒ Pastikan semua spesifikasi unit sesuai dengan WO/ Make sure all unit specifications are in accordance with the WO

Cell 1 checker / Signature: [Signature] Date: 18 JAN 2026

ASSEMBLY LINE 1 – CELL 2

Part below is neatly applied with silicone without gaps:

- ☒ Side glass (left & right)
- ☒ Front panel & blue side panel
- ☒ Profile cover
- ☒ Back of module
- ☒ pastikan kabel sash glass tidak loose dan kabelnya tidak ada yang terkelupas/ make sure the sash glass cable is not loose and the cable is not peeling off

Part: Sash glass

- ☒ Tidak ada scratch atau noda di sash glass/ No scratch or dirty on sash glass

Part: Aluminum diffuser

- ☒ Pastikan tidak ada yang tajam, bersih dan tidak berminyak/ Ensure diffuser has no sharp edges, clean and not oily

Part: Side glasses

- ☒ Tidak ada retak di sekitar lubang kaca / No visible crack around the glass holes
- ☒ Tidak ada awal terlihat / No visible scratch
- ☒ Kaca ditempelkan dengan kuat ke bingkai dinding samping / Glass is tightly taped to the side wall frame

Part: Blower housing

- ☒ Pasang kuat dan lengkap nut, ring per & ring plat pada keempat sudutnya / Installed tightly with complete M8 washers & nuts
- ☒ Pastikan tidak ada yang bocor dari semua sisi filter dengan cara menghidupkan blower/ make sure no lacking from all sides of the filter (turning on the blower)
- ☒ Pasang blower dan pastikan tegangan blower sesuai dengan WO/ Install the blower and make sure the blower voltage is in accordance with the WO : ☒ 230 V ☐ 115 V

- ☒ Kabel untuk blower diikat dengan rapi ke modul menggunakan kabel tie/ Cable for blower is neatly tied to the module using cable tie
- ☒ Kabel untuk blower koneksinya terpasang dengan benar / Cable connection for blower is install correctly.

239 Brown → L, 240 Blue → N, 241 G/Y → E, 242 Brown → JMP, 243 Blue → JMP, 247 Red → RX, 248 Black → C

- ☒ Hidupkan blower dan pastikan tidak ada suara bersiul/ Turn on the blower and ensure no whistling sound

- ☒ Pastikan kabel AC dan DC tidak disatukan bersamaan/ Ensure AC and DC cable are not harnessed together

- ☒ Pastikan pengunci yang digunakan untuk mengunci blower housing/plenum adalah lock nut/ Make sure the lock used to lock the blower housing/plenum is a lock nut

Part: Filter

- ☒ Tidak ada sela atau renggang antara housing blower dengan down flow filter / No gap between the base of blower housing and top of down flow filter

- ☒ Pastikan unit sudah di PAO/ Make sure the unit already do PAO testing

- ☒ Pastikan selang PAO sudah terpasang dan tidak terlipat/ Make sure the PAO hose is installed and not folded

Part: Red cover

- ☒ Screw panhead harus lengkap / No lacking pan head screw
- ☒ Tidak ada panhead screw yang longgar / No loose panhead screw
- ☒ pastikan gasket sudah dipasang di red cover dan damper / make sure the gasket is installed on the red cover and damper

Part: Airflow sensor

- ☒ Airflow sensor donat dipasang harus menyentuh filter/ Airflow sensor doughnut housing is facing the filter
- ☒ Airflow sensor koneksi kabelnya terpasang dengan benar/ Airflow sensor cable connection is correct.

Part: Sash glass

- ☒ Tidak ada scratch atau noda di sash glass/ No scratch or dirty on sash glass
- ☒ pastikan kabel sash glass tidak loose dan kabelnya tidak ada yang terkelupas/ make sure the sash glass cable is not loose and the cable is not peeling off

Part: Damper

- ☒ Dipasang damper / Damper is already installed

Part: Solenoid Valve

- ☒ Solenoid valve harus dipasang sesuai dengan WO /Solenoid valve is installed based on WO specification

Part: Service Fixture

- ☒ Test dan Pastikan service fixture tidak ada yang bocor di area piping dan pesambungan piping/ Ensure no leak on service fixture piping area

Tekanan/ Pressure: 4 Kg/cm2

Waktu/ Time: 5 Minute

Cell 2 checker / Signature: [Signature] Date: 20 Jan 2026

ASSEMBLY LINE 1 – CELL 3

Part: Module

- ☒ Kualitas powder coating pada module/ Powder coating quality on module

☒ Warna rata pada semua part/ *Uniform colour on all parts*
☒ Tidak ada goresan dan kotoran pada semua part/ *No scratch and dirt on all parts*
Part: Sash glass
☒ Tidak ada scratch atau noda di sash glass/ *No scratch or dirty on sash glass*
☒ Pastikan handle sash glass sudah dilem semua permukaannya dengan sempurna/ *Make sure the sash glass handle glue covers the whole handle surface*
Untuk unit dengan motorized sash / For units with motorized sash
☒ Periksa status lem motorized bracket – area bracket harus ter-cover seluruhnya / *Check glue status of motorized bracket – the bracket area must be fully covered*
Part: Side glasses
☒ Tidak ada scratch atau noda di side glass/ *No scratch or dirty on side glass*
Part: Single tray
☒ Gap dari dinding samping sama atau lebih kecil dari 3mm / *Gap from side wall is equal to or lesser than 3mm (min 1 mm)*
☒ Total gap baik dari armrest atau dinding belakang 3mm / *Total gap from either armrest or back wall is 3mm (min 1 mm)*
☒ Plastik untuk S/S tray tidak ada yang koyak / *Plastic for S/S tray is not removed*
☒ Pastikan tidak ada bengkok di area lubang perforated / *Ensure No dent/ bent on the perforated area*
Part: Multi-piece trays
☒ Gap dari dinding samping sama atau lebih kecil dari 3mm / *Gap from side wall or in between trays is equal to or lesser than 3mm (min 1 mm)*
☒ Total gap baik dari armrest atau dinding belakang 3mm / *Total gap from either armrest or back wall is 3mm (min 1 mm)*
☒ Plastik untuk S/S tray tidak ada yang koyak / *Plastic for S/S tray is not removed*
☒ Pastikan tidak ada bengkok di area lubang perforated / *Ensure No dent/ bent on the perforated area*
Part: Aluminum diffuser
☒ Tidak ada yang kurang Thumb screw / *No lacking thumb screw*
☒ Tidak ada thumb screw yang longgar / *No loose thumb screw*
Part: Front profile cover
☒ Profil harus flat dengan modul, bar panel depan dan bagian bawah kabinet dengan toleransi maksimum 1mm / *Profile is flashed to the module, front panel bar and base of cabinet w/ maximum 1mm tolerance*
☒ Pastikan tidak ada yang tajam, bersih dan tidak berminyak / *Ensure diffuser has no sharp edges, clean and not oily*
Part: Roller / Tubular motor for sash glass
☒ Tidak ada yang kurang sekrup panhead / *No lacking panhead screw*
☒ Tidak ada panhead screw yang longgar / *No loose panhead screw*
Part: Sash glass
☒ Tidak ada gap/ sela antara kaca dan armrest ketika tertutup sepenuhnya / *No gap between glass and armrest when fully closed*
☒ Pegangan Kaca tidak miring / *Glass handles are not slanting*
☒ Busur plastik dipasang / *Plastic arcs are installed*
Part: Mesh Paper Catch -> If Ordered
☒ Pastikan mesh paper catch sudah dipasang / *Make sure mesh paper catch is installed*

Cell 3 checker / Signature: *[Signature]* Date: *20 Jan 2026*

Part: Sash glass
 Tidak ada scratch atau noda di sash glass/ *No scratch or dirty on sash glass*
☒ Berikan silikon pada sudut-sudut sash handle. Pastikan semua silikon joint bersih, rapi dan tersilikon penuh / *Put silicon on the edges of the Sash Handle. Make sure all silicone joints are clean, neat and full disilicone*
Untuk unit dengan motorized sash / For units with motorized sash
☒ Berikan silikon pada sudut-sudut motorized bracket. Pastikan semua silikon joint bersih, rapi dan tersilikon penuh / *Put silicon on the edges of the motorized bracket. Make sure all silicone joints are clean, neat and full disilicone*
Part: Side glasses
☒ Tidak ada scratch atau noda di side glass/ *No scratch or dirty on side glass*
Part: Front panel
☒ Front panel harus rata dengan modul dan bar atas dengan toleransi 1mm / *Flushed to module and top bar with tolerance of 1mm*
☒ Countersunk hinges tidak ada yang kurang / *No lacking countersunk screw on the hinges*
☒ Front panel tidak ada dent atau goresan terlihat / *No visible dents or scratches anywhere on the front panel*
Part: Wiring from module to electrical panel
☒ Tidak ada konektor yang terbalik pasang / *No mismatched connectors*
☒ Joinan konektor ke elektrik panel harus bentuk L (90°) / *L-shape wiring from connector on electrical panel to module*
Part: Outlet (Optional)
☒ GFCI, Universal, EO-H harus diinstall di unit / *GFCI, universal, EO-H is installed on the unit*
Part: IV bar provision (for AC2_S)
☒ Pasang panhead screw dengan ring plat dan ring per ke lobang IV-BAR yang terdapat di S/S inner liner 4 PCS / *4pcs panhead screws with washers are installed to the IV bar provision holes found on the S/S inner liner*
Part: Front profile cover
☒ Profil berkelebat ke modul, bar panel depan dan basis kabinet dengan toleransi maksimum 1mm / *Profile is flashed to the module, front panel bar and base of cabinet w/ maximum 1mm tolerance*
Part: Side cover plate
☒ Pasang side cover dan ukurannya sesuai dengan lubang side cover / *Installed flashed to the module*
☒ Tidak ada yang kurang screw countersunk / *No lacking countersunk screws*
Part: Grounding cable
☒ Kunci ke stud dengan cup nut untuk kedua sisi kabel grounding / *Locked to the studs with cup nuts on both ends on the cable*
☒ Pastikan pallet bersih sebelum dikirim ke Electrical QC / *Make sure the pallet is clean before sending to electrical QC*
Part: Power Inlet
☒ Pasang power inlet dengan benar / *Power inlet have been installed correctly.*
Part: Pallet
☒ Pastikan pallet bersih sebelum dikirim ke Electrical QC / *Make sure the pallet is clean before sending to electrical QC*
Part: Damper
☒ Pastikan sudah dikencangkan dengan benar / *Make sure the damper is properly tightened.*
Part: Electrical drawing
☒ Pastikan electrical drawing sudah lengkap / *Make sure the electrical drawing is complete*
Part: Service Fixture
☒ Pastikan service fixture sudah terpasang (jika diorder sesuai dengan WO) / *Make sure the service fixture is installed (if ordered according to WO)*
Part: Cable Port
☒ Pastikan gasket kabel port sudah dipasang dengan gasket yang tipis / *Make sure the port cable gasket is installed with a thin gasket*
Part: Accessories and retrofit box
☒ Pastikan semua aksesoris dan retrofit box sudah lengkap sesuai dengan WO / *Make sure all accessories and retrofit boxes are complete in accordance with the WO*

ASSEMBLY LINE 1 – CELL 4

Part: Module
☒ Kualitas powder coating pada module/ *Powder coating quality on module*
☒ Warna rata pada semua part/ *Uniform colour on all parts*
☒ Tidak ada goresan dan kotoran pada semua part/ *No scratch and dirt on all parts*
SILICONE APPLICATION
Part: Module
☒ Pastikan semua unit sudah disilicone pada bagian samping, inner liner dan module/ *Ensure that all units are silicone on the side, inner liner and module*
☒ Pastikan semua joinan silicone sudah bersih, rapi dan disilicone full / *Make sure all silicone joints are clean, neat and full disilicone*

QUALITY CONTROL CHECKLIST FOR AC2-NS G4 & AC2-N G4

Part: Profile

☒ Pastikan silk screen sudah ada di profile/ *Silk screen sash height indicator*

Part: WO

☒ Pastikan airflow alarm Enable/Disable tercantum dalam WO/ *Make sure the airflow alarm state Enable/Disable on the WO*

Cell 4 checker / Signature: [Signature] Date: 20/Jan/16

TESTING

Turn ON unit and ensure the following are working

☒ Posisi kaca ditutup, hidupan unit: pastikan UV tidak hidup / *Sash down, connect main power up: shall not see light UV illuminate*

☒ Pastikan pada displaynya harus UV mode: tidak ada tulisan yang hilang, atau tulisan yang aneh/ *Display shall be in UV mode: Shall not see missing, weird characters and UV is switch on*

☒ Tekan tombol UV: Pastikan pada display tidak ada tulisan yang hilang, atau tulisan yang aneh/ *Press UV button: Shall not see missing, weird characters and UV is switch on*

☒ Naikkan kaca ke posisi "sash height": UV harus mati pada display harus posisi "sash height"/ *Bring sash to sash height: UV is switch off, light illuminate to indicate sash height position*

☒ Tekan tombol FAN: Semua lampu pada tombol harus otomatis hidup beberapa detik dan mati. FAN warming Up/ *Press FAN button: All buttons light illuminated for a few seconds and light switch off. Fan is warming up mode*

☒ Di mode airflow DISABLE, unit harus 3 menit Warming UP/ *In airflow monitor DISABLE mode, unit should have the 3 minutes warming up time*

☒ pada mode airflow DISABLE, alarm harus sama dengan ENABLE mode, kecuali untuk suara alarm/ *In airflow monitor DISABLE mode, alarms should be the same as ENABLE mode, except for the audible alarm*

☒ Pastikan blower tetap hidup ketika sash diturunkan ke posisi standby/ *blower shall be ON when the sash down to standby height.*

☒ Nama software dan versi yg digunakan benar./ *Software name and version used correct*

Software Name: JBUCB

Software Version: V1.2.3.1

Refer to SD-ELC-19

Tester/Signature: [Signature] Date: 21 Jan 2016

FINAL CLEANING

☒ Pastikan semua material S/S yang ada proses welding atau grinding sudah di-passivation/ *Ensure that parts that processed in welding or grinding was passivated*

Cleaning checker/Signature: [Signature] Date: 22 Jan 2016

FINAL QA INSPECTION

Part: Module

☒ Kualitas powder coating pada module/ *Powder coating quality on module*

☒ Warna rata pada semua part/ *Uniform colour on all parts*

☒ Tidak ada goresan dan kotoran pada semua part/ *No scratch and dirt on all parts*

Part: Silicone

☒ Make sure all silicone joins are clean, neat and full silicone

Complete cabinet Sticker labels

☒ Serial No. ☒ 220V ☒ 115V ☒ Silk screen

☒ Airflow sticker ☒ Esco Logo ☒ Red cover sticker.

☒ Inlet sticker ☒ Sash glass sticker ☒ EC sticker

☒ UL & NSF ☒ Airstream vinyl sticker ☒ Damper

Refer to SD-QCA-91 AC2-NS G4 Labeling

No lacking screws

☒ Red cover ☒ Roller ☒ Front panel hinges ☒ Side cover

☒ Profile cover ☒ Diffuser

SILICONE APPLICATION

☒ Make sure all silicone joins are clean, neat and full silicone.

Part: Sash Glass

☒ Dapat bergerak ke atas dan ke bawah dengan mudah/ *Can be moved up and down smoothly.*

☒ Ketinggian sash safe adalah 10 mm dari atas armrest/ *Safe sash height is 10 mm above the armrest.*

☒ Pastikan lem gagang kaca selempang menutupi seluruh permukaan pegangan / *Make sure the sash glass handle glue covers the whole handle surface.*

☒ Pastikan tidak ada cela antara sash glass dan sash wiper atau sash top plate saat melakukan paper test / *Make sure there are no gaps between the sash glass and the sash wiper or sash top plate when doing the paper test.*

☒ Pastikan kabel sash glass tidak longgar dan tidak tekupas/ *Make sure the sash glass cable is not loose and the cable is not peeling off.*

☒ Periksa apakah ada silikon di sudut-sudut sash handle/ *Check if have silicon on the edges of the Sash Handle.*

Untuk unit dengan motorized sash / For units with motorized sash

☒ Periksa apakah ada silikon pada sudut-sudut motorized bracket/ *Check if have silicon on the edges of the motorized bracket.*

Part: Diffuser sudah dirap

☒ Celah Kiri dan celah kanan harus sama / *Left and right gap are same*

☒ tidak ada celah ke carcass / *No gap to carcass*

☒ Tidak ada lekukan, Bekas toll dan penyok / *No curve, toll mark and dent*

☒ Tidak ada ujung atau sisi atau titik yang tajam pada kabinet / *No sharp edges or points anywhere on the cabinet*

☒ Tidak ada lapisan powder coating yang tipis atau scratch / *No thin powder coating or scratched powder coating*

☒ Tidak ada bekas stud atau las yang terlihat / *No visible stud marks or welding marks*

☒ Service fixture terpasang sesuai dengan WO / *Service fixture are installed as indicated on WO*

☒ Pastikan diffuser tidak tajam, bersih, dan tidak berminyak / *Ensure diffuser has no sharp edges, clean and not oily*

☒ Pastikan balancing stopper telah terpasang (4 buah) / *Make sure the balancing stopper has been installed (4 pcs)*

Part: Single tray & Multi Tray

☒ Jarak antara sisi tray dan sisi kiri dan kanan inner liner lebih kecil dari 2.5 mm (Minimal 3mm)/ *Gap from side wall is equal to or lesser than 2.5 mm, (min 3 mm)*

☒ Gap keseluruhan dari armres ke innerliner belakang adalah 5 mm (minimal 1mm)/ *Total gap from either armrest or back wall is 5mm, (min 1 mm)*

☒ Pastikan seluruh cup nut pada armrest terpasang lengkap/ *Ensure the cup nut on the armrest complete*

Part: Blue profile cover

☒ Profil harus flat dengan modul, bar panel depan dan bagian bawah kabinet dengan toleransi maksimum 1mm / *Profile is flashed to the module, front panel bar and base of cabinet w/ maximum 1mm tolerance*

Turn ON unit and ensure the following are working.

☒ Posisi kaca ditutup, hidupan unit: pastikan UV tidak hidup/ *Sash down, connect main power up: shall not see light UV illuminate.*

☒ Pastikan pada displaynya harus UV mode: tidak ada tulisan yang hilang, atau tulisan yang aneh/ *Display shall be in UV mode: Shall not see missing, weird characters and UV is switch on*

☒ Tekan tombol UV: Pastikan pada displaynya tidak ada tulisan yang hilang, atau tulisan yang aneh/ *Press UV button: Shall not see missing, weird characters and UV is switch on*

☒ Naikkan kaca ke posisi "safe height": UV harus mati pada display harus posisi "safe height"/ *Bring sash to safe height: UV is switch off, light illuminate to indicate safe height position.*

☒ Tekan logo tombol FAN: FAN warming up: unit harus 3 menit warming UP/ *Press the FAN logo button: Fan is warming up mode: unit should have the 3 minutes warming up time,*

☒ UV Lamp /sash should be fully closed and ensure magnet is detected, (Shake left and right)

☒ Blower/ safe height position and ensure magnet is detected, (Shake left and right)

☒ LED lamp ☒ Electrical outlets

☒ Turn on the blower and ensure no whistling sound.

☒ Pastikan blower tetap hidup ketika sash diturunkan ke posisi standby/ *blower shall be ON when the sash down to standby height.*

Part: LCD

☒ LCD berfungsi / *LCD are working*

☒ Tidak ada goresan / *No scratch.*

☒ Karakter/huruf yang ditampilkan pada LCD lengkap / *Complete character displayed on the LCD.*

☒ Semua simbol/menu berfungsi Ketika ditekan / *All buttons are responding when pushed*

For AC2 units with motorized sash

☒ Naik dan turunkan sash sebanyak 10 kali / *Test by moving up and down the sash 10 times.*

☒ Pastikan ketika sash posisi tertutup penuh terdapat celah 1-5mm antara sash dan armrest dan LCD menampilkan "Sash: Fully Closed" (TUV) / *Ensure when fully close there is a gap between front sash glass to the armrest has 1-5 mm and LCD will display "Sash: Fully Closed" (TUV)*

☒ Pastikan blower tetap hidup ketika sash diturunkan ke posisi standby/ blower shall be ON when the sash down to standby height.

☒ Pastikan kaca tidak bergetar Ketika digoncangkan / *Ensure that the glass is not shaking when you shake it.*

☒ Nama software dan versi yg digunakan benar. / *Software name and version used correct.*

Software Name: SE103-1-2-31

Software Version: 94-1-0-1-02-b

Refer to SD-ELS-332

☒ Pastikan SN di LCD sudah sesuai dengan SN di WO/ *Make sure the SN on the LCD is the same as the SN on the WO*

S/N : 2026-219690

Electrical Panel

☒ Stiker nomor EP sesuai dengan nomor EP pada ceklis 'Replaceable Component' / *EP number sticker matches the EP number on the replaceable component's checklist.*

☒ Electrical drawing disimpan di dalam plastik map / *Electrical drawing inside the plastic envelope.*

☒ Kabel LED harus memiliki celah dengan LCD / tidak longgar atau menggantung / *LED Lamp wiring should have a gap with the LCD Display / should not be loose or hanging.*

Part: Cable Port

☒ Pastikan gasket kabel port sudah dipasang dengan gasket yang tipis / *Make sure the port cable gasket is installed with a thin gasket*

Part: Outlet (Optional)

☒ Semua Outlet (GFCI, EO-H, etc..) Harus dipasang jika dipesan dan pastikan dapat berfungsi dengan baik / *All Outlets (GFCI, EO-H, etc.) must be install if ordered and make sure can function properly.*

Part: Shipping Mode

☒ Setelah semua pengecekan Screen selesai, aktifkan **Shipping Setup** untuk menghapus data history selama kabinet dioperasikan di factory. Pergi ke menu Service dan pilih menu **Shipping Setup**, tekan tombol 'Set shipping mode'. / *After all Screen checks are complete, activate Shipping Setup to delete history data while the cabinet is operated at the factory. Go to the Service menu and select the Shipping Setup menu, and press the 'Set shipping mode' button.*

Part: Diffuser

☒ Celah Kiri dan celah kanan harus sama / *Left and right gap are same*

☒ Tidak ada celah ke carcass / *No gap to carcass*

☒ Tidak ada lekukan, Bekas toll dan penyok / *No curve, toll mark and dent.*

Part: Service Fixture

☒ Test dan Pastikan service fixture tidak ada yang bocor di area piping dan pesambungan piping / *Ensure no leak on service fixture piping area*

Tekanan/ Pressure: 4 Kg/cm2

Waktu/ Time: 5 Minute

Retrofit Box

☒ User manual/OnePage

☒ Test report

☒ Cord set A

☒ Service Fixture:

☒ Outlet SP1 219690 and FAT has same

(Note: German language manual for Germany & Austria units)

Part: Bagian bawah/Bottom part (support stand joint area)

☒ Periksa apakah posisi nutsert sudah tepat atau belum. Nutserts harus benar-benar lurus / *Check all nutsert position if slanted or not. Nutserts must be fully straight.*

QA inspector / Signature: Rosh Date: 23-1-2028

PACKING

☒ Cek model support stand sesuai dengan WO/ *Check support stand model according to WO*

☒ Cek kualitas pallet/ *Check quality of pallet*

☒ Cek kualitas karton box/ *Check quality of carton box*

☒ Cek label dan harus benar sesuai dengan WO/ *Check all labels and must be correct according to WO*

☒ Cek semua aksesories sudah di masukkan sesuai dengan WO/ *Check all the accessories have been entered in accordance with the WO*

- Support Stand

Exhaust Collar ☒

☒ Cek kualitas packing, semua busa harus dipasang dan dan dibungkus dengan benar/ *Check the quality of packing, all the foam should be installed and is shrink wrapped properly.*

Packer / Signature: [Signature]

Date: 23/1/26

Additional Checklist for SBC Centurion BSC G4

Cabinet Model : AC2-4H7 6410"

JO : 2026 - 219690


(Please do after calibration is finished)

SASH IN FULLY OPEN POSITION	Tester	QA
Posisi sash terdeteksi dan tampilan pada sistem kontrol menunjukkan "Fully Open" <i>Sash position is detected and the display on the control system is showing "Fully Open"</i>	✓	✓
Alarm Audio diaktifkan. <i>Audio Alarm is activated.</i>	✓	✓
Saat opsi mute diketuk, alarm dinonaktifkan selama 1 menit. <i>When the mute option is tapped, the alarm is deactivated for 1 minute.</i>	✓	✓
Opsi FAN dapat menghidupkan dan mematikan blower. <i>The FAN option can turn on and turn off the blower.</i>	✓	✓
Saat FAN dihidupkan, amati waktu pemanasan. <i>When the fan is turned on, observe warm up time. (Default: 1 minute for Degree C; 3 Minutes for Esco Airflow Sensor).</i>	✓	✓
Opsi LIGHT dapat menghidupkan dan mematikan lampu. <i>The LIGHT option can turn on and turn off the lamp.</i>	✓	✓
Opsi SOCKET dapat mengaktifkan dan menonaktifkan stopkontak listrik di dalam area kerja kabinet dengan benar. <i>The SOCKET option can properly activate and deactivate the electrical outlet inside the cabinet's work area.</i>	✓	✓
Opsi UV tidak dapat menghidupkan dan mematikan lampu UV. <i>The UV option can't turn on and off the UV lamp.</i>	✓	✓
SASH IN SASH READY OR SASH HEIGHT POSITION	Tester	QA
Posisi Sash terdeteksi, dan lamp diaktifkan (jika sebelumnya mati) <i>Sash position is detected, and lamp is activated (if previously off)</i>	✓	✓
Alarm audio dinonaktifkan (jika sebelumnya aktif) <i>Audio alarm is deactivated (if previously on)</i>	✓	✓
Opsi FAN dapat menghidupkan dan mematikan blower <i>The FAN option can turn on and turn off the blower</i>	✓	✓
Saat FAN dihidupkan, amati waktu pemanasan <i>When the fan is turned on, observe warm up time. (Default: 1 minute for Degree C; 3 Minutes for Esco Airflow Sensor)</i>	✓	✓
Saat FAN dimatikan, perhatikan waktu pembersihan. (Default: 0 menit) <i>When the fan is turned off, observe purging time. (Default: 0 minute)</i>	✓	✓
Opsi LIGHT dapat menghidupkan dan mematikan lampu <i>The LIGHT option can turn on and turn off the lamp</i>	✓	✓
Saat lampu menyala, tekan dan tahan simbol LIGHT; penjadwal LIGHT akan muncul <i>When the light is turned on, press and hold the LIGHT symbol; the light scheduler shall appear</i>	✓	✓
Opsi SOCKET dapat mengaktifkan dan menonaktifkan stopkontak listrik di dalam area kerja kabinet dengan benar	✓	✓

Additional Checklist for SBC Centurion BSC G4

The SOCKET option can properly activate and deactivate the electrical outlet inside the cabinet's work area	✓	✓
Opsi UV tidak dapat menghidupkan dan mematikan lampu UV The UV option can't turn on and off the UV lamp	✓	✓
SASH IN STANDBY HEIGHT POSITION	Tester	QA
Posisi Sash terdeteksi dan tampilan pada sistem kontrol menunjukkan "Standby" Sash position is detected and the display on the control system shows "Standby"	✓	✓
Kabinet lamp akan dimatikan secara otomatis Cabinet lamp will be turned off automatically	✓	✓
Ikon FAN setengah akan muncul di area ikon FAN Half fan Icon will appear on the fan icon area	✓	✓
Saat FAN dimatikan, alarm akan diaktifkan When fan turned off, alarm will be activated	✓	✓
Opsi lampu kabinet tidak berfungsi Cabinet lamp option is not working	✓	✓
Opsi lampu UV tidak berfungsi UV lamp option is not working	✓	✓
SASH IN FULLY CLOSED POSITION	Tester	QA
Posisi Sash terdeteksi dan tampilan pada sistem kontrol menunjukkan "Sash: Fully Closed" Sash position is detected and the display on the control system shows "Sash: Fully Closed"	✓	✓
Alarm Audio dinonaktifkan (jika sebelumnya aktif) Audio Alarm is deactivated (if previously on)	✓	✓
Opsi FAN tidak berfungsi (Opsi Cahaya dinonaktifkan) The FAN option is not working (The Light Option is disabled)	✓	✓
Opsi LIGHT tidak berfungsi (Opsi Cahaya dinonaktifkan) The LIGHT option is not working (The Light Option is disabled)	✓	✓
Opsi SOCKET berfungsi (Opsi Soket diaktifkan) The SOCKET option is working (The Socket Option is enabled)	✓	✓
Opsi UV dapat menghidupkan dan mematikan lampu UV The UV option can turn on and off the UV lamp	✓	✓
SELF RESET TEST	Tester	QA
Atur Sash pada Tinggi Sash Nominal Set sash on Nominal Sash Height	✓	✓
Nyalakan Kipas Turn on the Fan	✓	✓
Buka Panel Depan Open the Front Panel	✓	✓
Tempatkan termo-anemometer di zona kerja (untuk cabinet 1 blower) Place thermo-anemometer on work zone (for cabinet with one blower)	✓	✓
Untuk Cabinet dengan dua blower, pasang flowhood untuk mengecek inflow	✓	✓

Additional Checklist for SBC Centurion BSC G4

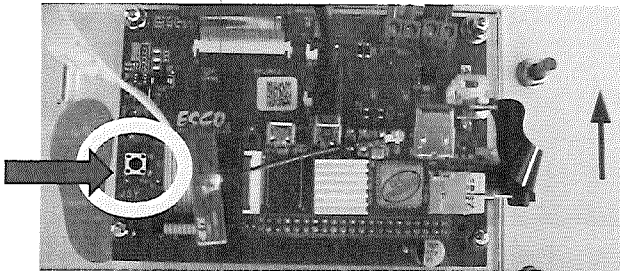For Cabinet with two blowers, install a flowhood to check the inflow	✓	NA
Lakukan reset sendiri dengan menekan tombol reset di belakang LCD Do self-reset with press reset button behind LCD	✓	✓
		
Blower masih berjalan selama reset sendiri The Blower is still running during self-reset	✓	✓
Nilai downflow yang ditunjukkan dalam thermo-anemometer tidak turun di bawah acceptance (untuk cabinet 1 blower) There is downflow value shows in thermo-anemometer not down under acceptance (for cabinet with one blower)	✓	✓
Nilai downflow yang ditunjukkan dalam thermo-anemometer dan inflow yang ditunjukkan oleh flowhood tidak turun di bawah acceptance (untuk cabinet 2 blower) The downflow value indicated in the thermo-anemometer and the inflow indicated by the flowhood do not drop below acceptance (for cabinet 2 blower)	✓	✓
"System Refresh" muncul di layar "System Refresh" appear on screen	✓	✓
"Loading Screen" tidak muncul "Loading Screen" not appear	✓	✓
Buzzer Tidak Berbunyi Buzzer Doesn't sound	✓	✓
POWER FAILURE NOTIFICATION TEST	Tester	QA
Setelah calibration cabinet selesai, atur sash dalam keadaan nominal Once the calibration cabinet is complete, set the sash in a nominal state	✓	✓
Matikan fitur wifi di menu Auxiliary function (Wifi harus dimatikan setelah selesai testing dan sebelum dikirim ke step berikutnya) Turn off the wifi feature in the Auxiliary function menu (Wifi must be turned off after testing is complete and before sending to the next step)	✓	✓
Atur waktu dan tanggal sesuai dengan waktu dan tanggal disaat pengetesan Set the time and date according to the time and date of the test	✓	✓
Kembali ke Menu Utama, Nyalakan Blower, Cabut Power selama lebih dari 3 menit. Return to Main Menu, Turn on the Blower, Unplug Power for more than 3 minutes.	✓	✓
Power Failure Notification Muncul Power Failure Notification Shown	✓	✓

- Baterai ada

Tester By :

Irham Pangastika

Date :

21 Jan 2024

QA Check By :

Rash

Date :

23-1-2024

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

1. **Identify the problem.** The first step in the problem-solving process is to identify the problem. This involves recognizing the issue, understanding its scope, and determining its impact.

2. **Analyze the problem.** Once the problem is identified, the next step is to analyze it. This involves breaking the problem down into smaller, more manageable parts and understanding the underlying causes.

3. **Generate solutions.** After analyzing the problem, the next step is to generate potential solutions. This involves brainstorming ideas and considering different approaches to solving the problem.

4. **Evaluate solutions.** Once potential solutions have been generated, the next step is to evaluate them. This involves comparing the solutions against the problem and determining which one is the most effective and feasible.

5. **Implement the solution.** The final step in the problem-solving process is to implement the chosen solution. This involves putting the solution into action and monitoring its progress.

6. **Review the solution.** After implementing the solution, the final step is to review it. This involves evaluating the results of the solution and determining whether it has effectively solved the problem.



SN: 2026 - 219690 —

QA		1st Packer		Final Packer	
Date	Name	Date	Name	Date	Name
23-Jan-2026	Resch	23 Jan-2026	Murphy	23/1/26	Murphy

